



PARA: José Luis Santacruz Santacruz  
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO: Recepción Definitiva

18 NOV. 2011


FECHA:

No.: 0001683 GOP-UF  
H.R. TE-4706-10 / 6682-10  
Código: LIC 2008-04

Remito acta de entrega recepción definitiva, así como también el documento de aprobación respectivo de la obra "Ampliación y mejoramiento de la antigua vía a Conocoto, desde la intersección con I avenida Simón Bolívar hasta el puente sobre el Río San Pedro, parroquia Conocoto", a cargo del ingeniero Napoleón Soria Bohórquez, con cédula de ciudadanía 170402043-5.

De la misma se desprende que el Contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con las cláusulas contractuales, especificaciones técnicas y más normas vigentes en la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a la delegación otorgada por el señor Gerente de Obras Públicas y sobre la base de la recomendación emitida por la Comisión de Recepción, se da por recibida la obra en forma definitiva.

  
Ing. David Puente Calle  
Jefe de Fiscalización de Infraestructura Nueva

- Copia: Asesoría Jurídica  
Contabilidad  
Archivo  
Fiscalizador  
Contratista  
Auditoría Interna  
UCPC  
Contribución y Mejoras

EMMOP-Q  
UNIDAD FINANCIERA  
Nombre:   
Fecha: 21/11/2011  
Hora:  
Firma: 



Elaborado por: Sra. Liliana Vivas P., Secretaria

EPMMOP  
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS  
RECIBIDO EN  
ASESORÍA JURÍDICA  
21 NOV. 2011  
María Eugenia Ulloa  
RECEPCIONISTA

  
21 NOV 2011




**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS  
PÚBLICAS  
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN UNIDAD DE FISCALIZACIÓN**

**APROBACIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN**

Una vez revisada el Acta de Entrega Recepción Definitiva, suscrita el 4 de julio de 2011, del contrato No.:2009 – 0001 -- L, con código No.: LIC 2008-04, relacionado con los trabajos: Ampliación y mejoramiento de la Antigua Vía a Conocoto, desde la intersección con la Avenida Simón Bolívar hasta el puente sobre el Río San Pedro, parroquia Conocoto, preparada por la Comisión designada para el efecto y que se adjunta a la presente, encontramos que las conclusiones a que llegan son correctas; por lo tanto, al ratificarla, se aprueba la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

La obra fue ejecutada por el ingeniero Napoleón Soria Bohórquez., mediante Contrato suscrito el 26 de enero de 2009.



Ing. Miguel Vacas C.  
Supervisor Enc.




Ing. David Puente Calle  
Jefe de Fiscalización de Infraestructura Nueva

APROBADO POR:



Ing. Jaime Rivera Delgado  
Gerente de Obras Públicas- Subrogante



**EPMOP**  
Empresa Pública  
Metropolitana  
de Movilidad y  
Obras Públicas

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA VÍA A CONOCOTO, DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR HASTA EL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN PEDRO, PARROQUIA CONOCOTO", A CARGO DEL INGENIERO NAPOLEÓN SORIA BOHÓRQUEZ..

En Quito, a los 04 días de julio de 2011, comparecen por una parte en representación de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas EPMOP, los ingenieros: Hugo Flores, Oswaldo Navarrete y Segundo González, Técnicos Delegados; designados mediante memorando GOP-UF-2501, de 22 de julio de 2011. Por otra parte el ingeniero Miguel Vacas C., Fiscalizador del proyecto; y, en su calidad de contratista el ingeniero Napoleón Soria B., con el objeto de suscribir el Acta de Recepción Definitiva de obra, al tenor de las siguientes cláusulas

### PRIMERA: ANTECEDENTES

El 26 de enero de 2009 se celebró un contrato de ejecución de obra N° 2009-001-L por USD 2'735.257,05, con un plazo de 300 días a partir de la entrega del anticipo que se realizó el 26 de enero de 2009.

La Recepción Provisional se la realizó el 28 de julio de 2010, en la que consta el detalle de las cantidades de obra contratada, ejecutada, liquidación económica, reajuste de precios y liquidación de plazo.

Durante la ejecución de la obra se aprobaron:


- |  |                |
|--|----------------|
| o Incrementos de cantidades de obra        | USD 682.193,95 |
| o Costo más porcentaje                     | USD 232.198,59 |
| o Prórroga de plazo (incluye suspensiones) | 160 Días       |

### SEGUNDA: RECEPCIÓN

El contratista mediante solicitud presentada con fecha 01 de julio de 2011, solicitó la recepción definitiva de los trabajos.

El Fiscalizador, en su informe, recomienda que una vez que el contratista ha cumplido con el periodo de prueba y las observaciones que constan en el Acta de Recepción Provisional, es procedente iniciar los trámites para la Recepción Definitiva.





**EPMOP**  
Empresa Pública  
Metropolitana  
de Movilidad y  
Obras Públicas

Los miembros de la comisión constituidos en el sitio de la obra, proceden a efectuar la inspección correspondiente, determinando que se ha cumplido con el objeto del contrato, observaciones constantes en el Acta de Recepción Provisional y por consiguiente acuerdan suscribir el Acta de Recepción Definitiva.

### OBRA EJECUTADA

El Contratista ejecutó los trabajos que se detallan en el Acta de Recepción Provisional y cuyo resumen es el siguiente:

TRABAJOS	MONTO USD	
	Contratado	Ejecutado
<b>Contrato Principal</b>		
Trabajos descritos en el Acta Provisional	2,735,257.05	3,194,203.37
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,194,203.37</b>
<b>Orden de Trabajo (C+%)</b>		
	2,321,198.59	190,173.43
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>190,173.43</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3,384,376.80</b>

El proyecto fue liquidado en 16 planillas de avance de obra y una planilla de "costo más porcentaje", acorde al siguiente detalle y dejando constancia de que el anticipo ha sido devengado en su totalidad.

#	Valor Planilla	Deducción anticipo	Retención / devolución	Multas	Reajuste de precios	Liquidado a pagar
Anticipo	1,367,628.53				32,139.27	32,139.27
1	61,606.10	30,803.05			723.87	31,526.92
2	13,144.49	6,572.25			185.34	6,757.58
3	19,980.76	9,990.38			281.73	10,272.11
4	25,148.30	12,574.15			354.59	12,928.74
5	93,212.97	46,606.49			1,295.66	47,902.14
6	106,913.72	53,456.86			1,486.10	54,942.96
7	140,876.69	70,438.35			2,014.54	72,452.88
8	249,205.27	124,602.64			3,563.44	128,166.07
9	153,152.62	76,576.31			2,190.08	78,766.39
10	196,515.89	98,257.95		27,352.57	3,026.34	73,931.71
11	360,953.41	180,476.71			5,233.82	185,710.52
12	350,272.65	175,136.33		16,411.54	5,341.66	164,066.44
13	434,556.29	217,278.15			8,973.59	226,251.73
14	355,801.84	177,900.92			7,365.10	185,266.02
15	287,058.75	86,957.99		27,352.57	8,284.17	181,032.36
16	345,803.62				14,523.75	360,327.37
C+%	190,173.43					190,173.43
ReajDef					17,886.59	17,886.59
Totales	3,384,376.80	1,367,628.53		71,116.68	114,869.64	2,060,501.23

*[Handwritten signature]*



DISTRITO METROPOLITANO





**EPMMOP**  
Empresa Pública  
Metropolitana  
de Movilidad y  
Obras Públicas


## SEXTA: ACEPTACIÓN


Una vez que la Comisión ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como consta en el informe del Fiscalizador, esta Comisión declara su conformidad con la ejecución de la obra objeto de esta recepción, dando por recibidos los trabajos en forma definitiva y por consiguiente, se debe tramitar la devolución de la garantía de Fiel cumplimiento, como lo establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

Para constancia y en fe de lo actuado, suscribimos la presente Acta de Recepción Definitiva del contrato, en original y 10 ejemplares del mismo tenor y contenido.


  
Ing. Hugo Flores  
Delegado

  
Ing. Oswaldo Navarrete B.  
Delegado

  
Ing. Segundo González  
Delegado

  
Ing. Miguel Vacas C.  
Fiscalizador

  
Ing. Napoleón Soria B.  
CONTRATISTA  
CC. 170402043-5.



**EPMOP**  
 Empresa Pública  
 Metropolitana de  
 Movilidad y  
 Obras Públicas

**EMPRESA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS**  
**GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**UNIDAD DE FISCALIZACION**  
**INFORME DE APROBACION DE ACTA RECEPCION DEFINITIVA**

LIC 2008-04

**OBRA:** AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ANTIGUA VIA A CONOCOTO  
**UBICACIÓN:** DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA PUENTE SOBRE EL RÍO SAN PEDRO, PARROQ. CONOCOTO

**CONTRATISTA:** ING. NAPOLEÓN SORIA BOHORQUEZ      **FISCALIZADOR:** Ing. Miguel Vacas C.

**Fecha del Contrato:** 26 de enero de 2009

**MONTO ORIGINAL:** \$ 2,735,257.05      Sin IVA      **PLAZO:** 300 días

**Fecha de inicio:** 26 de enero de 2009      **LIBRO DE OBRA**

**MONTO ANTICIPO (50%):** \$ 1,367,628.53

**Fecha de anticipo:** 26 de enero de 2009

**Suspensión parcial, valorado a los ítems que no podrán ejecutarse:** 130 días

**Prórroga de plazo:** Orden de Cambio N° 1      30 días

**Fecha de terminación, incluido prórrogas:** 30 de abril de 2010

VARIACIONES DEL CONTRATO		MONTOS
Contrato Principal		2,735,257.05
Contrato complementario		0.00
Incrementos/Disminuciones autorizadas	Orden de Cambio N° 1	682,193.95
	<b>Monto total:</b>	<b>3,417,451.00</b>
<b>COSTO MAS PORCENTAJE:</b> Autorizado mediante Orden de Trabajo N° 1		232,198.59

**EVALUACION DEL CRONOGRAMA**

	Acum. Anterior	Este periodo	Acumulado	%
Monto programado		3,417,451.00	3,417,451.00	100.00
Monto Ejecutado		3,384,376.80	3,384,376.80	99.03
Monto Mínimo que debió ejecutar (100% + 80%)	0.00	2,733,960.80	2,733,960.80	80.00
Adelanto \$		0.00		
Diferencia \$		33,074.20		
Días de atraso	no	Multa / día: 0.20%	<b>MULTA</b>	no
			<b>MONTO \$</b>	

Atraso en presentación de planilla      días

**CONTROL DE CALIDAD**      Todos los rubros planillados cumplen con las especificaciones y normas vigentes en la Institución y Controló, los materiales y su calificación se encuentran bajo el control de la Fiscalización con la asistencia de Laboratorio particular y de la Universidad Católica para el ensayo de la briquetas de la carpeta asfáltica.

**NARRATIVO**      La obra se desarrolló dentro de lo reprogramado, los trabajos concluyeron el 30 de abril de 2010, dentro del plazo contractual más suspensión y prórroga. Pese a no haberse ocupado la totalidad del incremento solicitado en los rubros contractuales, la obra se encuentra concluida cumpliendo el objeto contractual. Existe una diferencia del monto acumulado, que será ocupado en cubrir rubros no contractuales bajo la modalidad de "costo más porcentaje". Con estos antecedentes se suscribe el Acta de Recepción Definitiva.

**FECHA:** 30/07/2011 15:15


Ing. Miguel Vacas C.  
**FISCALIZADOR**

**NOTA:** Coloque los datos respectivos en las celdas en recuadro.

RAS







**EPMMOP**  
Empresa Pública  
Metropolitana  
de Movilidad y  
Obras Públicas

PARA: Miembros Comisión de Recepción

ASUNTO: Recepción Definitiva

FECHA: 22 JUL 2011

No.: **02501**  
GOP-UF  
H.R. TE-MAT-008390-11

En atención al oficio 1-07-CO-2011, de 1 de julio de 2011, relacionado con la "Ampliación y mejoramiento de la Antigua Vía a Conocoto, desde la intersección con la avenida Simón Bolívar hasta el puente sobre el Río San Pedro, parroquia Conocoto", esta Gerencia designa Miembros de la Comisión de Recepción Definitiva a los ingenieros Hugo Flores, Oswaldo Navarrete, Segundo González, Miguel Vacas, Fiscalizador y Napoleón Sorla, Contratista.

El acta deberá ser remitida a la Dirección de la Unidad de Fiscalización en el plazo de 15 días, a partir de la presente fecha.

Dipl. Ing. Mauricio Almeida Rothenbac  
Gerente de Obras Públicas - Encargado

2011-07-2013

Adjunto: Uno

Elaborado por:	Sra. Liliana Vivas, Secretaria
Responsabilidad de:	Ing. Miguel Vacas, Supervisor Zona Sur, Encargado
Revisado por:	Ing. David Puente, Director de Fiscalización y Control de Obras, Enc.
Aprobado por:	Ing. Jaime Rivera, Director de Infraestructura

# Ing. Napoleón Soria Bohórquez

Construcciones Civiles

0008390

Quito, 01 de julio de 2011

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Oficio No. 1-07-CO-2011

Sr. Ingeniero  
Miguel León Torres  
DIRECTOR UNIDAD DE FISCALIZACIÓN  
Presente.-


Referencia: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA VIA CONOCOTO, DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR HASTA EL PUENTE SOBRE EL RÍO SAN PEDRO, PARROQUIA CONOCOTO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
CONTRATO No. 2009-0001-L-EMMOP-Q

De mis consideraciones:


Señor Ingeniero, me permito comunicar que se han ejecutado todas las correcciones dispuestas por la comisión, por lo tanto solicito se realice la Recepción Definitiva del contrato de la referencia.


Por la atención que se sirva dar a la presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ing. Napoleón Soria Bohórquez  
CONTRATISTA





ORDEN DE CAMBIO N° 1 (UNO)  
 SOLICITUD DE INCREMENTO DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO N° LIC 2008-04

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ampliación y mejoramiento de la Antigua Vía a Conocoto, desde la intersección de la Av. Simón Bolívar hasta el Puente sobre el Río San Pedro, parroquia Conocoto.

DATOS CONTRACTUALES:

CONTRATISTA: Ing. Napoleón Soria Bohorquez  
 FISCALIZADOR: Ing. Miguel Vacas C.

FECHA DE INICIO: 26 de enero de 2009  
 PLAZO: 300 días  
 FECHA DE TERMINO: 21 noviembre 2009  
 SUSPENSIÓN: 130 DÍAS  
 FECHA DE VENCIMIENTO DEFINITIVO:  
 31 DE MARZO DE 2010  
 MONTO CONTRATADO: \$ 2'735.257,05

DESCRIPCIÓN DEL ACTA: El incremento de cantidades de obra se debe principalmente a la reforma necesaria para reforzar la estructura existente, de conformidad a lo indicado por la Unidad de Estudios, además del mejoramiento del sistema de drenaje de la vía. Trabajos adicionales que no fueron considerados en el presupuesto inicial, por lo tanto varios rubros sufren esta variación.

En resumen el incremento es de: \$ 682.193,95

Que representa el 24,95% del monto original del contrato.

EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:

Valor del contrato:	\$ 2'735.257,05
Valor de obra adicional:	\$ 682.193,95
Valor total del contrato:	\$ 3'417.451,00

El monto de esta acta de incremento de cantidades de obra corresponde al 24,95 % del monto del contrato y como consecuencia se solicita se considere un tiempo adicional de 30 días, en la ejecución de obra.

INFORMACION GENERAL DE APROBACIONES ANTERIORES:

Valor Ordenes de Trabajo:	\$ 0.00
Valor Contrato Complementario:	\$ 0.00
Ampliaciones de plazo aprobadas por 0 días	Vigencia Anterior hasta: 31 marzo 2010


FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO: 30 de ABRIL de 2010


El que suscribe ha dado cuidadosamente atención al incremento de obra solicitado y por lo tanto proveerá todo el equipo, materiales, mano de obra, etc., y se compromete a ejecutar los trabajos descritos anteriormente a satisfacción de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas y por los precios unitarios establecidos en el contrato. De la misma manera acepta la modificación del plazo como se expresa en este documento.

Aceptado por:

  
 Ing. Napoleón Soria Bohorquez  
 Contratista

La responsabilidad de lo consignado en esta Acta de Ejecución de Obras Adicionales es de la Fiscalización.

  
 Ing. Miguel Vacas C.  
 Fiscalizador




ORDEN DE CAMBIO Nº 1  
SOLICITUD DE INCREMENTO DE CANTIDADES DE OBRA


CODIGO Nº LIC 2008-04

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ampliación y mejoramiento de la Antigua Vía a Conocoto, desde la intersección de la Av. Simón Bolívar hasta el Puente sobre el Río San Pedro, parroquia Conocoto.

Revisado:

  
Ing. Oswaldo Navarrete.  
Supervisor

Visto Bueno:

  
Ing. Miguel León T.  
Jefe de Fiscalización

Certificación de Fondos


Por medio de la presente certifico que en el presupuesto de la EMMOP del año 2010, existe el saldo suficiente en la partida No. 5.7.5.01.05.008.00001, para la ejecución de este incremento de cantidades de obra. Conforme establece la Certificación Presupuestaria dada mediante memorando 109-GAF-UF-P, de 10 de febrero de 2010.


  
Patricio Olmedo Benalcázar  
Gerente Administrativo - Financiero

Aprobado por:

Fecha:


27 FEB/2010

  
Ing. Máximo Ramón C.  
Gerente Obras Públicas

  
Ing. Pablo Montalvo V.  
Gerente General

DOCUMENTACIÓN EN ANEXOS:

- 1.- Solicitud del contratista
- 2.- Informe técnico del Fiscalizador (debe contener la reprografía de la obra con cronograma valorado)
- 3.- Cuadro de cantidades y montos



GERENCIA DE OBRA PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE UNIDAD DE  
FISCALIZACIÓN

**EPMOP**  
Empresa Pública  
Metropolitana de  
Movilidad y Obras  
Públicas

**ORDEN DE TRABAJO No. 1**

(Rubros nuevos máximo 10% del valor del contrato reajustado)

PROYECTO Nº LIC - 2008 - 04

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ampliación de antigua vía a Conocoto, desde Av. Simón Bolívar hasta puente sobre el Río San Pedro, sector Conocoto, parroquia Conocoto.

**DATOS CONTRACTUALES:**

CONTRATISTA: Ing. Napoleón Soria Bohórquez.

FECHA DE INICIO: 26 de enero de 2009

PLAZO: 300 días

FECHA DE TERMINO: 21 noviembre 2009

FISCALIZADOR: Ing. Miguel Vacas C.

PRORROGA: 160 DÍAS

FECHA VENCE DEF.: 30 abril de 2010

MONTO CONTRATADO: \$ 2'735.257,05

**DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN No. 1:**

La orden de Trabajo No. 1 se debe a la creación de rubros necesarios para dotar de los servicios complementarios a la vía, principalmente: señalizaciones horizontal y vertical; reubicación de guardavías existentes en el sector, necesarios por la ampliación de la vía; reparación, reforzamiento y pintura del puente de Puengasi y otras obras no contempladas en el presupuesto. Cabe indicar que las cantidades de obra a ejecutarse han sido determinadas por la Fiscalización, los costos unitarios y totales han sido revisados y aprobados por la Dirección de Fiscalización. Esta Orden no requiere de certificación presupuestaria, toda vez que, hay un sobrante del monto del contrato más el incremento ya aprobado.

El Monto de esta Orden de Trabajos de rubros nuevos es de \$ 232.198,59 sin IVA que representa el 8,49% del Monto del Contrato.

**INFORMACIÓN GENERAL DE APROBACIONES ANTERIORES:**

Valor aprobado en Acta de Incremento de Cantidades de Obra: \$ 682.193,95

Valor aprobado en actas anteriores de Ordenes de Trabajo: \$ 0,00

Valor Contrato Complementario: \$ 0,00

Ampliaciones de plazo aprobadas por: 0 días. Vigencia Anterior hasta el: 30 abril de 2010

**FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO: 30 de abril de 2010**

El que suscribe ha dado cuidadosamente atención al cambio ordenado y por lo tanto proveerá todo el equipo, materiales, mano de obra, etc., y se compromete a ejecutar los trabajos descritos anteriormente a satisfacción de la EMOP-Q y por los precios unitarios aquí establecidos. De la misma manera acepta la modificación del plazo como se expresa en este documento.

Aceptado por:


  
Ing. Napoleón Soria Bohórquez  
/Contratista

La responsabilidad de lo consignado en esta Orden de Trabajo es de la Fiscalización.


  
Ing. Miguel Vacas C.  
Fiscalizador







**EPMIMOP**  
Empresa Pública  
Metropolitana  
de Movilidad y  
Obras Públicas

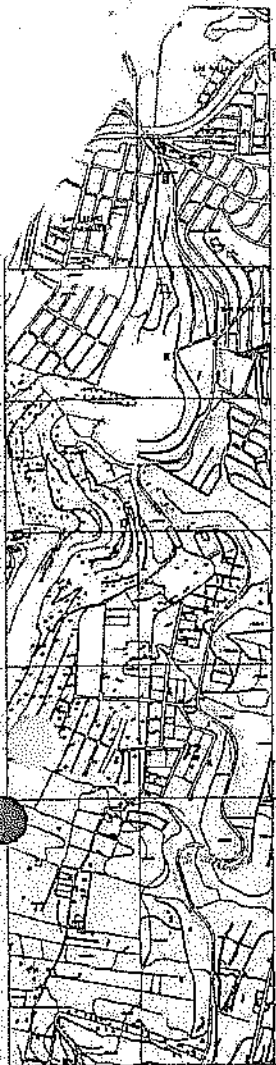


AV. SIMÓN BOLÍVAR

O.BRA: AMPLIACIÓN ANTIGUA VÍA A  
CONOCOTO, DESDE AV. SIMÓN  
BOLÍVAR HASTA PUENTE SOBRE  
EL RÍO SAN PEDRO, SECTOR  
CONOCOTO, PAREO VÍA  
CONOCOTO.

CONTRATISTA: ING. NAPOLEÓN SORIA B.

FISCALIZADOR: ING. MIGUEL VACAS C.

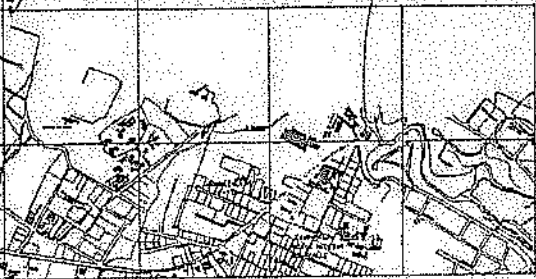

M 7-036  
PUENTE RÍO  
SAN PEDRO
