

PARA: Eco. Avelino Alcocer E.
Gerente Administrativo Financiero

ASUNTO: Reajuste de Precios

FECHA: - 4 MAR. 2009

No. GT-UF000462


Adjunto al presente, remito a usted la planilla de trabajos y reajuste de precios No. 1.0 correspondiente al periodo del 2008.12.01 al 2008.12.31 ejecutados en la obra

ADOQUINADO DE LA CALLE D(S-S57-E), ACCESO AL CUARTEL DE BOMBEROS, DESDE TRANSVERSAL 13 HASTA FIN DE CALLE BARRIO EL ROCIO-GUAMANI

a cargo del ING. ANDRADE RIVADERO CARLOS ALEJANDRO, la que ha sido aprobado por esta Unidad de acuerdo al siguiente detalle:

VALOR TRABAJOS	:	\$	2,903.19
Retencion Provisional	:	\$	0.00
Menos Anticipo/Otros	:	\$	1,451.60
Menos	:	\$	0.00
Valor liquido trabajos	:	\$	1,451.59
Valor del reajuste	:	\$	64.45
Reaj. provis. pagado	:	\$	0.00
Saldo del reajuste	:	\$	64.45
menos 0.5% I.N.E.C	:	\$	0.00
menos 0.5% Procur. y Otros	:	\$	0.00
Valor liquido del Reajuste	:	\$	64.45
Menos Reten. Provis. Reajuste	:	\$	0.00
VALOR LIQUIDO TOTAL A PAGAR	:	\$	1,516.04


Supervisor


Ing. René Alvarado S.
Jefe Unidad de Fiscalización (E)

SCB/ORB
2009.02.27

Anexo 4 hojas

c.c. Unidad UC-PC, Reajuste de Precios, Archivo, Contratista, Fiscalizador

CONTRATO: AB1308

PLANILLA No. 1.0 (B)

ADOQUINADO DE LA CALLE D(S-S57-E),ACCESO AL CUARTEL DE BOMBEROS,

DESDE TRANSVERSAL 13 HASTA FIN DE CALLE BARRIO EL ROCIO-GUAMANZ

CONTRATISTA: M116 ING.ANDRADE RIVADERO CARLOS ALEJANDRO

Fecha/oferta: 2008.06.01 INDICE SUB-UNO: 2008.12.01 al 2008.12.31

PROVISIONAL 1

COMPONENTES	COEFC	IND OFERT	IND EJECU	RELAC	SUBST.
0002 MANO DE OBRA	0.2250	14.45	14.45	1.0000	0.2250
0008 ADOQUINES HORNIGON(PICHIN	0.3290	210.63	215.07	1.0211	0.3359
0025 EQUIPO-MAQUINARIA VIAL	0.0900	119.25	123.47	1.0354	0.0932
0036 MATERIALES PETREOS(PICHIN	0.1260	352.24	377.89	1.0728	0.1352
0046 REPUESTOS MAQ.CONSTRUCCIO	0.0300	119.02	124.91	1.0425	0.0396
0048 PZS.H.FUND(TAPAS-REJILLAS	0.0300	168.16	269.60	1.6032	0.0481
0052 TUB.ACC.H.SIMPLE(PICHINCH	0.0130	208.97	220.45	1.0549	0.0137
0092 MADERA ASERR,CEP(PREPARAD	0.0190	320.11	358.57	1.1201	0.0213
0130 CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.0370	134.74	139.48	1.0352	0.0383
0301 CONBUS.NACIONAL(MEZCLA 5-	0.0120	137.34	137.34	1.0000	0.0120
0058 INDICE CONS.SALDO NAT (PI	0.0810	117.31	118.97	1.0142	0.0821

FACTOR DE REAJUSTE: 1.0444 - 1.0000 = 0.0444

Valor Planillado.....	2,903.19
(-) Otros ..	1,451.60
Valor Planillad - Antica	1,451.59
Factor de Reajuste.....	0.0444
VALOR DE REAJUSTE.....	64.45
Reaj. provis.pagado.....	0.00
SALDO DEL REAJUSTE.....	64.45
(-) 0.5% I.N.E.C.....	0.00
(-) Procuraduria y Ots	0.00
LIQUIDO A PAGARSE.....	64.45

PROCESADO POR

REVISADO POR




JEFE UNIDAD REAJUSTE

SC/TRO//Procesado en la Unidad de reajuste con fecha 2009.02.27

EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
INFORME DE APROBACIÓN DE PLANILLA DE OBRA

OBRA: Adoquinado de la calle D (S -S57-E), acceso al cuartel de Bomberos, desde transversal 13 hasta fin de calle barrio El Rocio de Guamaní, Parroquia Guamaní

UBICACIÓN: Entre

PLANILLA N° 1

PERIODO: 01/12/2008

CONTRATISTA: Ing. Carlos Alejandro Andrade Rivadero

FISCALIZADOR: Ing. Sergio Dillon P.

MONTO ORIGINAL: \$ 36,531.73 Sin IVA

Fecha de inicio: 1 de Diciembre de 2008

Prórrogas de plazo: 0 días

Fecha de terminación, incluido prórrogas: 28 de Febrero de 2009

VARIACIONES DEL CONTRATO

Contrato Principal

Contrato complementario

Incrementos / disminuciones autorizadas

MONTOS

36,531.73

0.00

0.00

Monto total 36,531.73

COSTO MAS PORCENTAJE: (autorizado) 0.00

EVALUACIÓN DEL CRONOGRAMA

	Acum.Anterior	Este periodo Diciembre (31)	Acumulado	%
Monto programado		9,397.45	9,397.45	25.72
Monto Ejecutado		2,903.19	2,903.19	7.95
Monto Mínimo que debió ejecutar (100% + 80%)	0.00	7,517.96	7,517.96	20.58

Adelanto \$ 0.00

Atraso \$ 6,494.26

Días de atraso 21 Multa /día 0.30%

Atraso en presentación de planilla 0 días

MULTA NO

MONTO \$ 409.14

PERIODO DE REAJUSTE 1ro al 31 de diciembre 2008

CONTROL DE CALIDAD

A cargo del laboratorio de materiales y suelos de la EMOP-Q (se adjunta ensayo). Los ensayos de hormigones para el rubro bordillos no cumplen con especificaciones.

Por lo expuesto la presente planilla se despacha en base al informe de fiscalización.

NARRATIVO

La obra NO se desarrolló con normalidad, por la interrupción y trabajos de la EMAAP-Q para la colocación y arreglo de acometidas domiciliarias de alcantarillado, agua potable e hidrantes. Por lo que No se aplica la multa por evaluación del cronograma.

El contratista presentó la planilla el 5 de enero de 2009, con hoja de ruta TE-0035-09, y en vista que el contratista no presenta los ensayos de control de calidad del rubro bordillos, no se cancela la totalidad del mencionado rubro, hasta esta fecha. Una vez verificadas las cantidades se da se trámite a la presente planilla.

DETALLE DE PAGO

Monto planillado		2,903.19
Menos anticipo	50%	1,451.60
Menos retenciones		0.00
Menos:	multa cronograma	
	Otras	0.00
Liquido a Pagar	USD	1,451.59

SON: Mil cuatrocientos cincuenta y un dólares con 59/100 cts.. DÓLARES

FECHA: Miércoles, Febrero 18, 2009

Ing. Sergio Dillon P.
FISCALIZADOR

Ing. Jorge Merlo P.
SUPERVISOR

Adoquinado de la calle D (S -S57-E), acceso al cuartel de Bomberos, desde transversal 13 hasta fin de calle barrio El Rocío de Guamaní, Parroquia Guamaní

Ing. Carlos Alejandro Andrade Rivadero

Excavación y relleno para estructuras menores (tubería para sumideros y sumideros)

Abscisa	No.	h1 sumidero	h2 pozo	ancho	longitud	h media	Vol. Parcial	Vol. Acum.
0+000	V1	0.80	1.00	0.60	4.00	0.90	2.16	2.16
0+020	V2	0.80	1.00	0.60	3.50	0.90	1.89	4.05
0+040	V3	0.80	1.25	0.60	4.55	1.03	2.81	6.86
0+060	V4	0.80	1.25	0.60	6.60	1.03	4.08	10.94
0+080	V5	0.80	1.00	0.60	3.00	0.90	1.62	12.56
0+100	V6	0.80	1.00	0.60	5.00	0.90	2.70	15.26
		altura	largo	ancho	cantidad			
Tazas		1.00	0.90	0.90	6		4.86	20.12
Total excavación							20.12	

Excavación y relleno para estructuras menores (m3)

20.12

Bordillo de hormigón simple Calle D

Abscisas		Lado	Longitud	Observ.
Desde	Hasta			
0+101.0	0+108.0	Derecho	7.00	curvo
0+102.4	0+200.5	Izquierdo	98.10	
0+121.0	0+191.5	Derecho	70.50	
0+191.5	0+196.9	Derecho	5.40	curvo

Bordillo de hormigón simple (m)

181.00

Construcción de sumidero

Colocados (u)

6.00

Construcción de sumidero (u)

6.00

Tubería para alcantarillado diam. 20 cm

Abscisa	No.	h1 sumidero	h2 pozo	dif. De h.	longitud	Long. Corr.
0+000	V1	0.80	1.00	0.20	4.00	4.00
0+020	V2	0.80	1.00	0.20	3.50	3.51
0+040	V3	0.80	1.25	0.45	4.55	4.57
0+060	V4	0.80	1.25	0.45	6.60	6.62
0+080	V5	0.80	1.00	0.20	3.00	3.01
0+100	V6	0.80	1.00	0.20	5.00	5.00

Tubería para alcantarillado diam. 20 cm (m)

26.71

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor
EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTF	M3	20.12	6.93	139.43
CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO	U	6.00	65.96	395.76

EMMOP | QUITO

Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas

TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO DI/	M1	26.71	8.26	220.62
CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN: Sec	U	1.00	232.76	232.76
Letreros Ambiental del Proyecto (0,6x1.2	U	1.00	149.20	149.20
SEÑAL: Hombres trabajando (0,60x 1.20	U	2.00	111.40	222.80
SEÑAL: Restricción de Velocidad (0,60x	U	2.00	98.75	197.50
SEÑAL: Desvío (0,60x 1.20 m)	U	2.00	111.40	222.80
SEÑAL: Peligro (0,40x 1.20 m).	U	2.00	111.40	222.80
SEÑAL: Prohibido el paso (0,60x 1.20 m)	U	2.00	111.40	222.80
Letreros preventivos(0,80x1,60) h=0,60 r	U	2.00	111.40	222.80
Publicaciones por prensa (Periódico Meti	U	1.00	117.97	117.97
Cinta Pástica Peligro	U	300.00	0.21	63.00
Conos	U	15.00	18.03	270.45

Total

2,900.69



Quito, 5 de enero del 2.009

Ofic. No. 001-CAAR-2009

Señor Ing.

René Alvarado

Jefe de la Unidad de Fiscalización de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas de Quito (EMMOP-Q)

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente adjunto la Planilla de Avance de Obra No. 01 (original y 5 copias) correspondiente a los trabajos de construcción de: **Adoquinado calle "D" (S-57-E) acceso al cuartel de Bomberos desde transversal 13 hasta fin de calle, barrio El Rocío de Guamaní, parroquia Guamaní.**

Adjunto a la misma podrá encontrar un resumen fotográfico que ilustra los trabajos realizados, cuadro y detalles de los volúmenes de obra, y demás anexos.

Conforme a su presentación, solicito a usted la aprobación y tramite correspondiente a fin de que se efectúe el pago respectivo, particular que informo a usted para los fines pertinentes.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,



Ing. Alejandro Andrade Rivadero
Contratista EMMOP-Q

EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS DE QUITO (EMMOP-Q)

CALCULO DE CANTIDADES DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 01

OBRA: Adoquinado calle "D" (S-57-E) acceso al cuartel de Bomberos desde transversal 13 hasta fin de calle, barrio El Rocío de Guamaní.

PLAZO: 90 DIAS CALENDARIO

CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO ANDRADE RIVADERO

FISCALIZADOR: ING. SERGIO DILLON P.

MONTO DE CONTRATO: USD. 36.531,73

ANTICIPO (50%): 18.265,87


FECHA DE INICIO: 1 de DICIEMBRE del 2.008

FECHA DE TERMINO: 27 de FEBRERO del 2.009

PERIODO DE TRABAJO: 1 de DICIEMBRE de 2.008 al 31 de DICIEMBRE de 2.008

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
307-2(1)	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES	m3	20,48

→ TUBERIA Ø=20 cm.:



ABSCISA	No.	DIMENSIONES (m)				VOLUMEN (m3)	OBSERVACION
		h1	h2	a	L		
0+059,00	V1	0,80	1,00	0,60	4,00	2,16	Sumidero 1 (Margen Izquierdo) Pozo 1
0+058,00	V2	0,80	1,00	0,60	3,50	1,89	Sumidero 2 (Margen Derecho) Pozo 1
0+100,00	V3	0,80	1,25	0,60	4,55	2,80	Sumidero 3 (Margen Izquierdo) Pozo 2
0+102,00	V4	0,80	1,25	0,60	6,60	4,06	Sumidero 4 (Margen Derecho) Pozo 2
0+194,40	V5	0,80	1,00	0,60	3,00	1,62	Sumidero 5 (Margen Izquierdo) Pozo 3
0+194,40	V6	0,80	1,00	0,60	5,00	2,70	Sumidero 6 (Margen Derecho) Pozo 3

→ TAZAS SUMIDEROS:

$V7 = (0,90 \times 0,90 \times 1,08) \times 6$ 5,25 m3 (Corresponde a 6 excavaciones (h=1.08) para Tazas de Sumideros)

$V_{TOTAL(1-7)} =$ 20,48 m3

610-(1)A BORDILLO HORMIGÓN $f_c=180 \text{ Kg/cm}^2$; h=50cm m 181,00

ABSCISA		TIPO	LONGITUD	OBSERVACION
DE	HASTA			
0+101,00	0+108,00	Curvo	7,00	Margen Derecho (Esquina Cuerpo de Bomberos)
0+102,40	0+200,50	Lineal	98,10	Margen Izquierdo
0+121,00	0+191,50	Lineal	70,50	Margen Derecho
0+191,50	0+196,90	Curvo	5,40	Margen Derecho

$L_{TOTAL} =$ 181,00 m

609-(2)S CONSTRUCCION DE SUMIDERO u 6,00

→ Conforme lo descrito en rubros anteriores:

CANTIDAD SUMIDEROS = 6 u

EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS DE QUITO (EMMOP-Q)

CALCULO DE CANTIDADES DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 01

OBRA: Adoquinado calle "D" (S-57-E) acceso al cuartel de Bomberos desde transversal 13 hasta fin de calle, barrio El Rocío de Guamaní.

PLAZO: 90 DIAS CALENDARIO

CONTRATISTA: ING. ALEJANDRO ANDRADE RIVADERO

FISCALIZADOR: ING. SERGIO DILLON P.

MONTO DE CONTRATO: USD. 36.531,73

ANTICIPO (50%): 18.265,87


FECHA DE INICIO: 1 de DICIEMBRE del 2.008

FECHA DE TERMINO: 27 de FEBRERO del 2.009

PERIODO DE TRABAJO: 1 de DICIEMBRE de 2.008 al 31 de DICIEMBRE de 2.008

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
609-(1)	TUBERIA PARA ALCANTARILLADO $\phi=20$ cm	m	26,71

→ TUBERIA $\phi=20$ cm.:



ABSCISA	LADO	DIMENSIONES (m)				LT (m)	OBSERVACION
		h1	h2	(h2-h1)	L		
0+059,00	IZQ.	0,80	1,00	0,20	4,00	4,00	Sumidero 1 (Margen Izquierdo) Pozo 1
0+058,00	DER.	0,80	1,00	0,20	3,50	3,51	Sumidero 2 (Margen Derecho) Pozo 1
0+100,00	IZQ.	0,80	1,25	0,45	4,55	4,57	Sumidero 3 (Margen Izquierdo) Pozo 2
0+102,00	DER.	0,80	1,25	0,45	6,60	6,62	Sumidero 4 (Margen Derecho) Pozo 2
0+194,40	IZQ.	0,80	1,00	0,20	3,00	3,01	Sumidero 5 (Margen Izquierdo) Pozo 3
0+194,40	DER.	0,80	1,00	0,20	5,00	5,00	Sumidero 6 (Margen Derecho) Pozo 3

$L_{TOTAL} = 26,71$ m

220-(1)	CHARLAS DE CONCIENTIZACION	u	1,00
---------	----------------------------	---	------

→ Se la realizó el día sábado 15 de noviembre del 2.008 a las 16h00

CANTIDAD = 1 u

711iF	LETRERO AMBIENTAL PROYECTO (0,6x1.20 m); h= 2m	u	1,00
-------	--	---	------

→ Conforme al contrato

CANTIDAD = 1 u

711iA	SEÑAL: Hombres trabajando (0.60x1.20 m)	u	2,00
-------	---	---	------

→ Conforme al contrato

CANTIDAD = 2 u

711iiA	LETRERO PREVENTIVO (0.80x1.60 m) h=0.60 m	u	2,00
--------	---	---	------

→ Conforme al contrato

CANTIDAD = 2 u

EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS DE QUITO (EMMOP-Q)**CALCULO DE CANTIDADES DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 01****OBRA:** Adoquinado calle "D" (S-57-E) acceso al cuartel de Bomberos desde transversal 13 hasta fin de calle, barrio El Rocio de Guamaní.**PLAZO:** 90 DIAS CALENDARIO**CONTRATISTA:** ING. ALEJANDRO ANDRADE RIVADERO**FISCALIZADOR:** ING. SERGIO DILLON P.**MONTO DE CONTRATO:** USD. 36.531,73**ANTICIPO (50%):** 18.265,87**FECHA DE INICIO:** 1 de DICIEMBRE del 2.008**FECHA DE TERMINO:** 27 de FEBRERO del 2.009**PERIODO DE TRABAJO:** 1 de DICIEMBRE de 2.008 al 31 de DICIEMBRE de 2.008

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
711iB	SEÑAL: Restricción de velocidad (0.60x1.20 m)	u	2,00
→ Conforme al contrato			
CANTIDAD = 2 u			
711iC	SEÑAL: Desvío (0.60x1.20 m)	u	2,00
→ Conforme al contrato			
CANTIDAD = 2 u			
711iD	SEÑAL: Peligro (0.60x1.20 m)	u	2,00
→ Conforme al contrato			
CANTIDAD = 2 u			
711iE	SEÑAL: Prohibido el Paso (0.60x1.20 m)	u	2,00
→ Conforme al contrato			
CANTIDAD = 2 u			
220-(1)C	PUBLICACIONES POR LA PRENSA - 2 COLUMNASx8cm	u	1,00
→ El anuncio de comunicación del inicio de obra fue publicado el día miércoles 3 de diciembre del 2.008 (se anexa copia)			
CANTIDAD = 1 u			
V012	CINTA PLASTICA REFLECTIVA	m	300,00
→			
CANTIDAD = 300 m			
V013	CONO VIAL	u	15,00
→ Conforme al contrato			
CANTIDAD = 15 u			

AMBIENTAL



CHARLA DE CONCIENTIZACION




VISTA DE LA ASISTENCIA A LA CHARLA

OBRA BASICA



EXCAVACION PARA BORDILLO DE HORMIGON

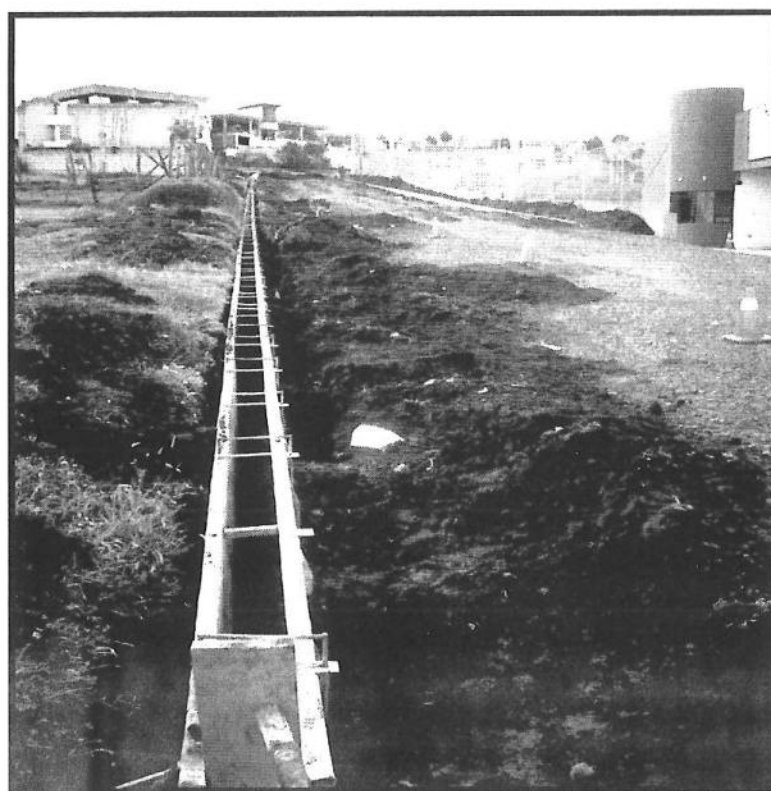

ENCOFRADO METALICO DE BORDILLO DE HORMIGON




FUNDICION DE BORDILLO DE HORMIGON ($f'_c=180 \text{ Kg/cm}^2$)




**EXCAVACION PARA CONSTRUCCION DE SUMIDERO Y TENDIDO DE
TUBERIA PARA ALCANTARILLADO (Diámetro de 20 cm.)**



**COLOCACION DE TAZA PARA SUMIDERO Y TENDIDO DE TUBERIA
PARA ALCANTARILLADO (Diámetro 20 cm.)**

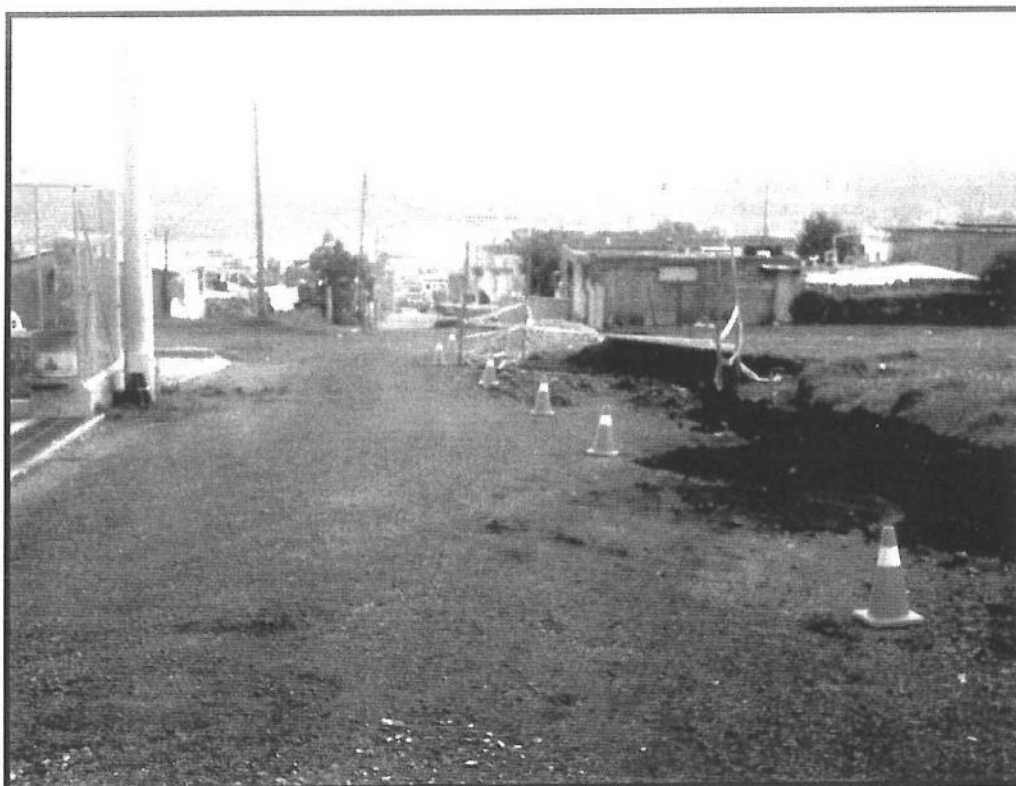

SEÑALIZACION

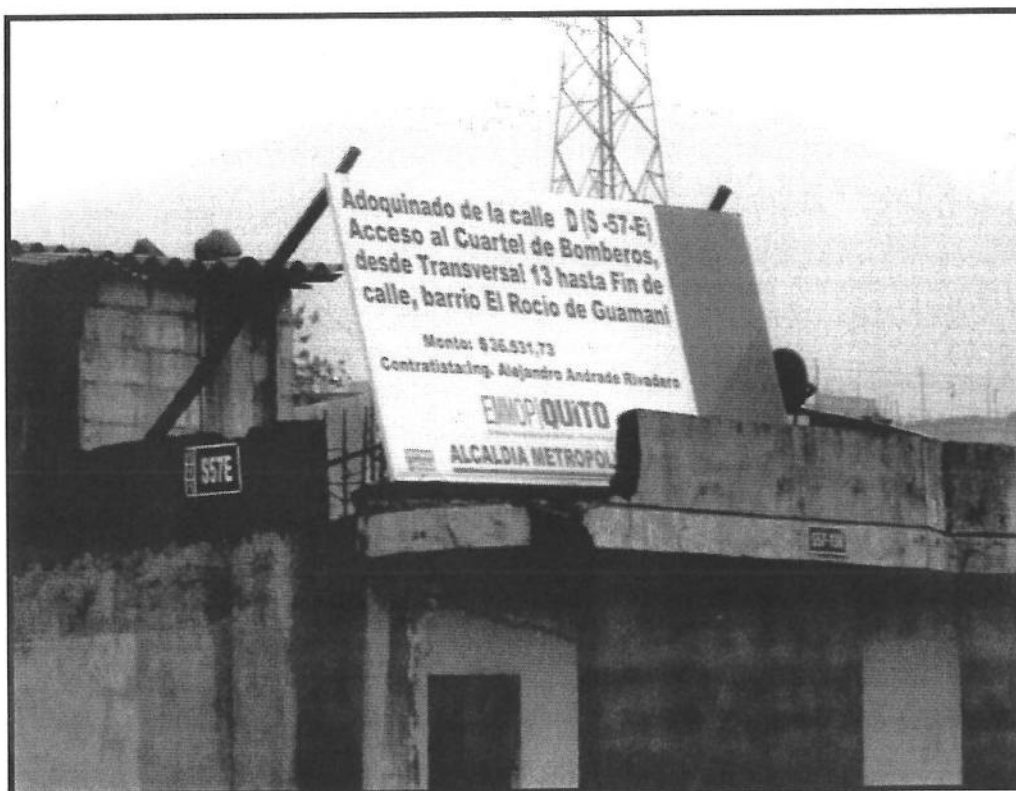

UBICACIÓN DEL LETRERO PRINCIPAL

CONEXIONES EMAAP-Q




IMAGENES DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ACOMETIDAS DE
ALCANTARILLADO, EJECUTADAS POR LA EMAAP-Q, A
DETERMINADOS LOTES



IMAGENES DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE, EJECUTADAS POR LA EMAAP-Q, A DETERMINADOS LOTES



IMAGENES DEL TRABAJO EJECUTADO POR LA EMAAP-Q PARA LA INSTALACION DE UN HIDRANTE (Lado Derecho) PARA EL CUERPO DE BOMBEROS "EL ROCIO DE GUAMANI"

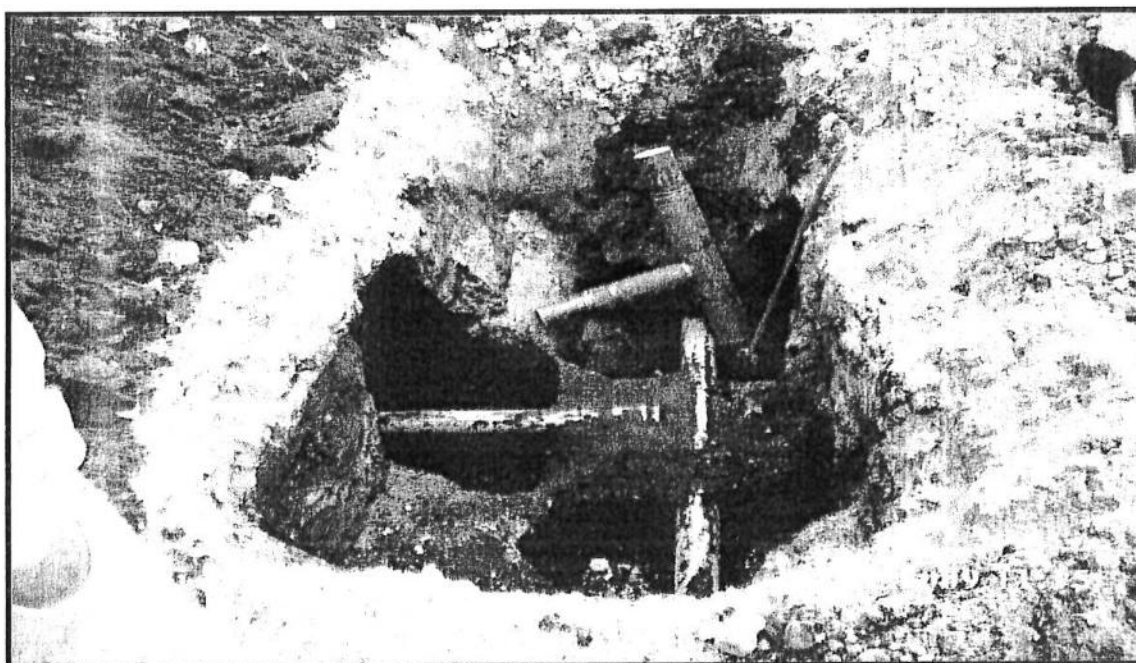

**IMAGENES DEL TRABAJO EJECUTADO POR LA EMAAP-Q PARA LA
INSTALACION DE UN HIDRANTE (Lado Izquierdo) PARA EL CUERPO DE
BOMBEROS "EL ROCIO DE GUAMANI"**

Actualidad

hugo@metrohoy.com.ec



Taxis, ahora hay más oferta que demanda
El representante de los choferes profesionales, Ricardo Onofre (foto), pidió una solución a la proliferación de taxis informales.

Sigue el vacío en Corte

DECISIÓN Los ex magistrados reiteraron que no integrarán la Corte de Justicia.

La integración de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sigue "en veremos". Ayer, 19 de los 21 jueces elegidos por sorteo decidieron no aceptar la disposición de la Corte Constitucional (CC) de posesionarse en los cargos.

Los ex magistrados se reunieron ayer en la Unión Nacional de Periodistas (UNP), desde las 10h45 hasta las 14h45, firmaron un documento y Roberto Gómez Mera, ex presidente de la desaparecida Corte Suprema, reiteró que los ex magistrados cesaron en sus funciones el 26 de octubre y que el 29 del mismo mes, el Consejo Electoral hizo el sorteo de forma extemporánea, lo cual no "constituye un aval ético para ejercer las funciones".

También resaltó que no existe Ley Orgánica de la CNJ que dé jurisdicción y competencia al organismo. Los ex magistrados no dejaron de recordar que su determinación la adoptaron respaldados en los artículos 33 y 66 de la Constitución que contempla la libertad laboral.

En tal virtud, expresó Gómez, "resulta absurdo e injurioso que se nos haya abierto una indagación previa por un supuesto delito que no se ha cometido". Finalmente, exhortó al fiscal a archivar la causa.

Por su parte, el ministro coor-



Reunidos - Los ex magistrados dialogaron por varias horas antes de reiterar su negativa a asumir los cargos.

dinador de la Política, Ricardo Patiño, cuestionó la decisión asumida por los ex jueces.

"Lamentamos que así sea. Yo intenté una mediación con ellos para buscar una salida que no rompa y no afecte la institucionalidad del país", dijo.

Aseguró que el Ejecutivo ha trabajado bajo el interés de que la Corte de Justicia sea independiente y que "nadie le meta mano". "El Ejecutivo no quería tener una corte propia, queremos que sea un organismo independiente", dijo.

Añadió que nadie puede obligar a los ex magistrados a ocupar un cargo y dijo que espera que en los próximos días se poseione la nueva Corte bajo los mecanismos que determinó la CC, es decir, con los conjuces o los titulares de las cortes provinciales.

SE DIJO EN LOS MEDIOS

GAMATV, Franklin Guala (representante trabajadores mineros): "Nosotros respaldamos al presidente Correa y a la Ley Minera".

ECUAVISA, Eduardo Hidalgo (director SOLCA): "Los recursos que SOLCA necesita deben ser oportunos y suficientes. Si pasamos al presupuesto del Estado ya no podremos acceder a esos recursos".

TELEAMAZONAS, Walter Poveda (ministro de Agricultura): "Mucha gente puede mal interpretar el término expropiación. Más bien se trata de una redistribución de tierras improductivas".

Pascual del Cioppo (dirigente del PSC): "El ingeniero (León) Febres Cordero fue trasladado a Estados Unidos a una clínica especializada en enfermedades pulmonares y esperamos que se recupere pronto. Por el momento está delicado pero estable".



SONORAMA
Patricio Pazmiño
Pte. Corte Constitucional.

No buscamos perseguir a nadie sino restablecer la institucionalidad de la justicia".

AVES DEL PAÍS

Comandante nuevo

Designación • El contralmirante Aland Molestina Malta fue posesionado ayer por el presidente Rafael Correa como nuevo comandante general de la Marina. Reemplaza en el cargo a Livio Espinosa.

Defiende operativo

Tiroteo • Jorge Jiménez, jefe de la Policía Judicial de Pichincha, dijo que los delinquentes abatidos en Pintag "no eran angelitos" ya que contra la banda había siete denuncias.

ANUNCIA EN:

metro hoy

Telf: 2256 075 2277 865

EMMOPQUITO

CAF

SE COMUNICA

A los moradores del Barrio El Rocio de Guamaní, Parroquia Guamaní, que se han iniciado los trabajos de adoquinado de la Calle D (S-57-E) acceso al Cuartel de Bomberos, desde Transversal 13 hasta fin de la calle. El proyecto está a cargo del Ing. Alejandro Andrade Rivadero. Se pide disculpas por las molestias temporales que se pudieran ocasionar. Gracias por su comprensión.

RIALTO GRAN FERIA DE SALDOS

Del 4 al 7 de Diciembre.

¡Compre su cerámica de piso y pared... a precios de fábrica!

Av. Maldonado 423 frente a la entrada a la Ecuatoriana Celular: 099255569

CHARLA DE CONCIENTIZACION COMUNITARIA

PROYECTO: Adoquinado calle "D" (S-57-E) acceso al cuartel de Bomberos desde transversal 13 hasta fin de calle, barrio El Rocio de Guamaní, parroquia Guamaní.

Listado de Asistentes

No.	NOMBRE	No. CEDULA CIUDADANIA	FIRMA
1	Sonia Guayacama Harg	171214246-3	Sonia Guayacama Harg
2	María Elena de Soria	170604765-4	María Elena de Soria
3	Mayra Mena	171748177-2	Mayra Mena
4	María Elena	170604765-4	María Elena
5	Pompeyo de Soria	171483053-6	Pompeyo de Soria
6	Sonia Guayacama	171483053-6	Sonia Guayacama
7	María Elena	171483053-6	María Elena
8	María Elena	171483053-6	María Elena
9	María Elena	171483053-6	María Elena
10	María Elena	171483053-6	María Elena
11	Luis SANCHEZ	170738277-4	Luis SANCHEZ
12	Rafael	170738277-4	Rafael
13	María Elena	172125757-6	María Elena
14	María Elena	172125757-6	María Elena
15	María Elena	172125757-6	María Elena
16	MARIA GUINATA	172125757-6	MARIA GUINATA
17	María Elena	172125757-6	María Elena
19	María Elena	172125757-6	María Elena
20			



De todo y a menor precio

**HORMIGONERA
& FERRETERIA MENA**

MENA ZAPATA MIGUEL PATRICIO
RUC: 0500685219001
PRINCIPAL: AV. 6 DE Diciembre N° 59-10 Y Juan Molinos
(Entrada al Comité del pueblo) Telfs: 3280713 / 3280712 / 2485989
SUCURSAL: Panamericana Sur Km 10 1/2 junto a Supermercados Santa María
Telfs. 3650139 / 2692516 / 2692953 - Quito Ecuador
AUT. SRI: 1106157750
S002-001

GUIA DE REMISION

Nº 0001395

CARRO No

FECHA:

Quito 16/12/2008.

NOMBRE DEL CLIENTE:

Ing. Andrade Alejandro

OBTENIDO POR:

VENTA ☒

TRASLADO ☐

MOTIVO DEL TRASLADO

Estimado Sr.(a). Sirvase proceder a la recepción del siguiente despacho que debo y pagaré.

CANTIDAD:	5	MTS 3 DE HORMIGON PREMEZCLADO f.c a los 28 días	180Kg
PLACA No:	PPW-676	CHOFER:	Carlos Cortez
NOMBRE DE LA OBRA:	El Rocio - Guamí		
DIRECCION DE LA OBRA:			
HORA DE SALIDA DE LA PLANTA:			
HORA DE LLEGADA A LA OBRA:			
HORA DE SALIDA DE LA OBRA:			
HORA DE LLEGADA A LA PLANTA:			
ADITIVO:			
ASENTAMIENTO:			
SERVICIO DE BOMBA:			
D LE:	S/ 8112		
OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES ESPECIALES:			

**HORMIGONERA
& FERRETERIA MENA**

RECIBIDO POR
[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

VENTA: El tiempo de llegada y salida de la obra debe ser controlada por el cliente el tiempo de descarga es de 5 minutos por metro cúbico, en caso de que se sobrepase el tiempo establecido se cobra 0,40 dolares por minuto. El hormigón se entregará en cantidad de metros cúbicos que se encuentra cancelado, en caso de solicitar mayor cantidad de lo pagado deberá ser cancelado el valor correspondiente antes de entregarse el hormigón premezclado en la obra. El hormigón de la planta es responsable al cliente, sin tener responsabilidad la Empresa del hormigón no utilizado. El cliente tiene la obligación de mantener por lo menos dos tanques de 55 galones con agua potable para el enfriamiento de la bomba de concreto y lavado de la tubería.

HORMIGONERA MENA no es responsable de la resistencia del hormigón, el cliente aumenta o reduce la resistencia en el caso de modificar la especificación en el día.

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA 2 AGENTE DE RETENCION



De todo y a menor precio

HORMIGÓN MENA
HORMIGONERA
& FERRETERIA

MENA ZAPATA MIGUEL PATRICIO

RUC: 0500685219001

PRINCIPAL: AV. 6 DE Diciembre N 59-10 Y Juan Molineros

(Entrada al Comité del pueblo) Telfs: 3280713 / 3280712 / 2485389

SUCURSAL: Panamericana Sur Km 10 1/2 junto a Supermercados Santa María
Telfs. 3650139 / 2692516 / 2692953 * Quito Ecuador

AUT. SRI: 1106157750
S002-001

GUIA DE REMISION

Nº 0001412

CARRO No L

FECHA: Quito 17 de Diciembre/2008

NOMBRE DEL CLIENTE: Ing Alejandro Andrade

ORL DO POR:

MOTIVO DEL TRASLADO

VENTA ☒

TRASLADO ☐

Estimado Sr.(a). Sirvase proceder a la recepción del siguiente despacho que debo y pagaré.

CANTIDAD: 5.5 MTS 3 DE HORMIGON PREMEZCLADO f c a los 28 días 180 Kg

PLACA No: PPW-676 CHOFER: Carlos Cortez

NOMBRE DE LA OBRA:

DIRECCION DE LA OBRA: El Rocío - Guamani

HORA DE SALIDA DE LA PLANTA:

HORA E LLEGADA A LA OBRA:

HORA DE SALIDA DE LA OBRA:

HORA DE LLEGADA A LA PLANTA:

ADITIVO:

ASENTAMIENTO: 10.

SERVICIO DE BOMBA:

DE E:

OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES ESPECIALES: 5/ 81129

SE CONTABILIZAN 4 m³ DESPACHADOS. SE LLAMO AL ING MENA

PARA OBSERVAR TBL SITUACION. De Cel.

Ferretería MENA

RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

FIRMA AUTORIZADA

VENTAS: La hora de llegada y salida de la obra debe ser controlada por el cliente el tiempo de descarga es de 5 minutos por metro cúbico, en caso de que se sobrepase el tiempo establecido se cobra 0,40 dolares por minuto. lo reclamo se deberá hacer dentro de las 24 horas en las oficinas de la Empresa, el dinero tiene la obligación de proporcionar 3 personas para armado y desarmado de la tubería cuando el servicio es con bomba. El hormigón se entregará en cantidad de metros cúbicos que se encuentra cancelado, en caso de solicitar mayor cantidad de lo pagado deberá ser cancelado el valor correspondiente antes de entregarse el hormigón premezclado en la obra. el hormigón de la planta es responsable el cliente, sin tener responsabilidad la Empresa del hormigón no utilizado. el cliente tiene la obligación de mantener por lo menos dos tanques de 55 galones con agua potable para el enfriamiento de la bomba de concreto y lavado de la tubería

HORMIGONERA MENA no se responsabiliza de la resistencia del hormigón, si el cliente aumenta agua o modifica la dosificación en la obra

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA 2 AGENTE DE RETENCION



De todo y a menor precio



MENA ZAPATA MIGUEL PATRICIO
RUC: 050085219001
PRINCIPAL: AV. 6 DE Diciembre N 59-10 Y Juan Molinos
(Entrada al Comité del pueblo) Telfs: 3280713 / 3280712 / 2485389
SUCURSAL: Panamericana Sur Km 10 1/2 junto a Supermercados Santa María
Telfs. 3650139 / 2692516 / 2692953 * Quito Ecuador
AUT. SRI: 1106157750
S002-001

GUIA DE REMISION

Nº 00014221

CARRO No

FECHA:

NOMBRE DEL CLIENTE:

ORL DO POR:

MOTIVO DEL TRASLADO

VENTA

TRASLADO

Estimado Sr.(a). Sirvase proceder a la recepción del siguiente despacho que debo y pagaré.

CANTIDAD:	5.5	MTS 3 DE HORMIGON PREMEZCLADO f c a los 28 días.	180 Kg.
PLACA No:	GOR-407	CHOFER:	Geovanny
NOMBRE DE LA OBRA:	El Rocio. Guamaní		
DIRECCION DE LA OBRA:	El Rocio. Guamaní		
HORA DE SALIDA DE LA PLANTA:			
HORA E LLEGADA A LA OBRA:			
HORA DE SALIDA DE LA OBRA:			
HORA DE LLEGADA A LA PLANTA:			
ADITIVO:			
ASENTAMIENTO:			
SERVICIO DE BOMBA:	NO.		
DE E:			
OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES ESPECIALES:	5/81198		
SE SOLICITO 5 m ³ NO 5.5 m ³ .			

DESPECHADO POR
FIRMA

RECIBIDO POR
FIRMA AUTORIZADA

VENTAS: La hora de llegada y salida de la obra debe ser controlada por el cliente el tiempo de descarga es de 5 minutos por metro cúbico, en o de que se sobrepase el tiempo establecido se cobra 0,40 dolares por minuto. lo reclamo se deberá hacer dentro de las 24 horas en las oficinas de la Empresa, el dinero tiene la obligación de proporcionar 3 personas para armado y desarmado de la tubería cuando el servicio es con bomba. El hormigón se entregará en cantidad de metros cúbicos que se encuentra cancelado, en caso de solicitar mayor cantidad de lo pagado deberá ser cancelado el valor correspondiente antes de entregarse el hormigón premezclado en la obra. el hormigón de la planta es responsable el cliente, sin tener responsabilidad la Empresa del hormigón no utilizado. el cliente tiene la obligación de mantener por lo menos dos tanques de 55 galones con agua potable para el enfriamiento de la bomba de concreto y lavado de la tubería

HORMIGONERA MENA no se responsabiliza de la resistencia del hormigón, si el cliente aumenta agua o modifica la dosificación en la obra

JOSE VILAR CALDERON BELTRAN RUC: 11060305000101 CALLE CALVO ALVARO Y SAN JOSE TEL: 3645493 FAX: 3645493 1997 AL 2000 CALVO ALVARO Y SAN JOSE

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR / COPIA 2 AGENTE DE RETENCION
