


RUBRO 1.001 DESBROCE Y LIMPIEZA

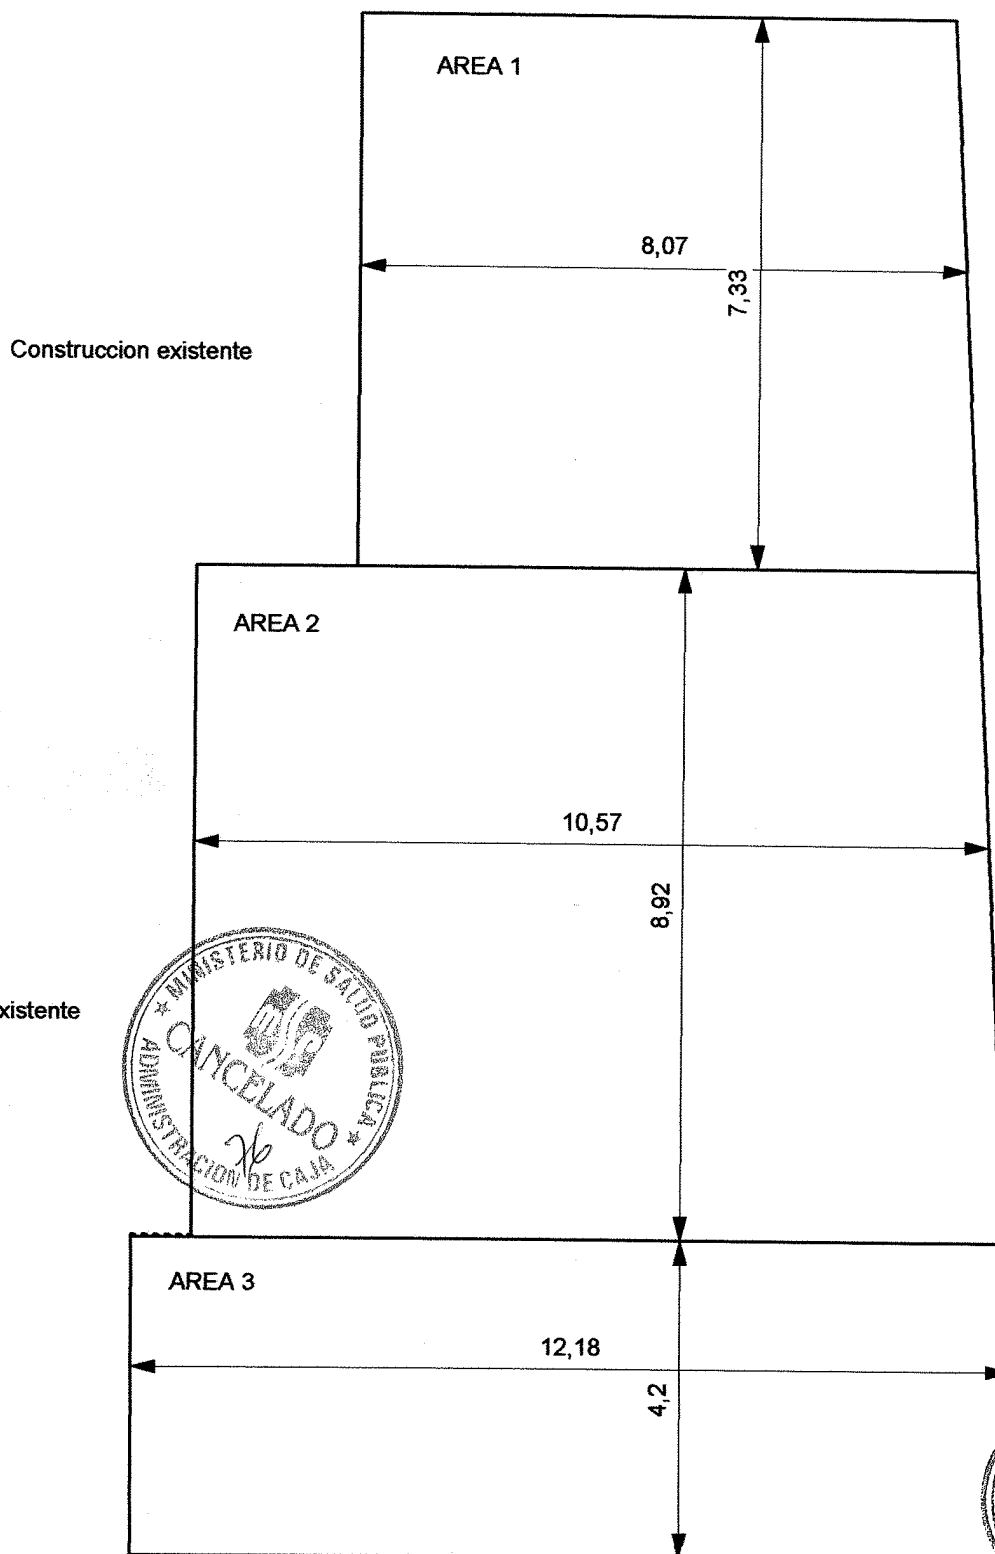

ANEXO

Obra: Construcción Centro de Salud de Ricaurte

Canton: Cuenca

PLANILLA DE OBRA No. UNICA

Rubro

1.002 Replanteo y nivelación

Largo medio (m)	Ancho medio (m)	Total (m2)	Observaciones
6.53	8.87	57.92	AREA 1
8.47	11.37	96.30	AREA 2
1.20	12.18	14.62	AREA 3

Total: 168.84 m2
8.01 m2 PLANILLA ADICIONAL
160.83 m2 PLANILLA CONTRACTUAL



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR


PROYECTO: Construcción Centro de Salud de Ricaurte, Provincia del Azuay
 RUBRO N° 1,002
 RUBRO: Replanteo y nivelación
 UNIDAD: m2
 PRECIO UNITARIO: 0.59

PLANILLA: UNICA
 PERIODO: 3 de Agosto al 31 de octubre 2006

ELEMENTO	DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
OBRAS PRELIMINARES	Replanteo y nivelación	168.84	
CANTIDAD CONTRACTUAL		160.83	
CANT. CONTRACTUALES EN PLANILAS ANTERIORES		0.00	
CANT. ADICIONALES EN PLANILAS ANTERIORES		0.00	
CANTIDAD EJECUTADA EN PRESENTE PERIODO		168.84	
CANTIDAD CONTRACTUAL EN PLANILLA ACTUAL		160.83	
CANTIDAD ADICIONAL EN PLANILLA ACTUAL		8.01	
CANTIDAD CONTRACTUAL ACUMULADA		160.83	
CANTIDAD ADICIONAL ACUMULADA		8.01	
VALOR DE RUBRO PLANILLA CONTRACTUAL ANTERIOR		0.00	
VALOR DE RUBRO PLANILLA ADICIONAL ANTERIOR		0.00	
VALOR DE RUBRO PLANILLA CONTRACTUAL		94.89	
VALOR DE RUBRO PLANILLA ADICIONAL		4.73	
VALOR DE RUBRO CONTRACTUAL ACUMULADO		94.89	
VALOR DE RUBRO ADICIONAL ACUMULADO		4.73	



RUBRO 1.002 REPLANTEO Y NIVELACION

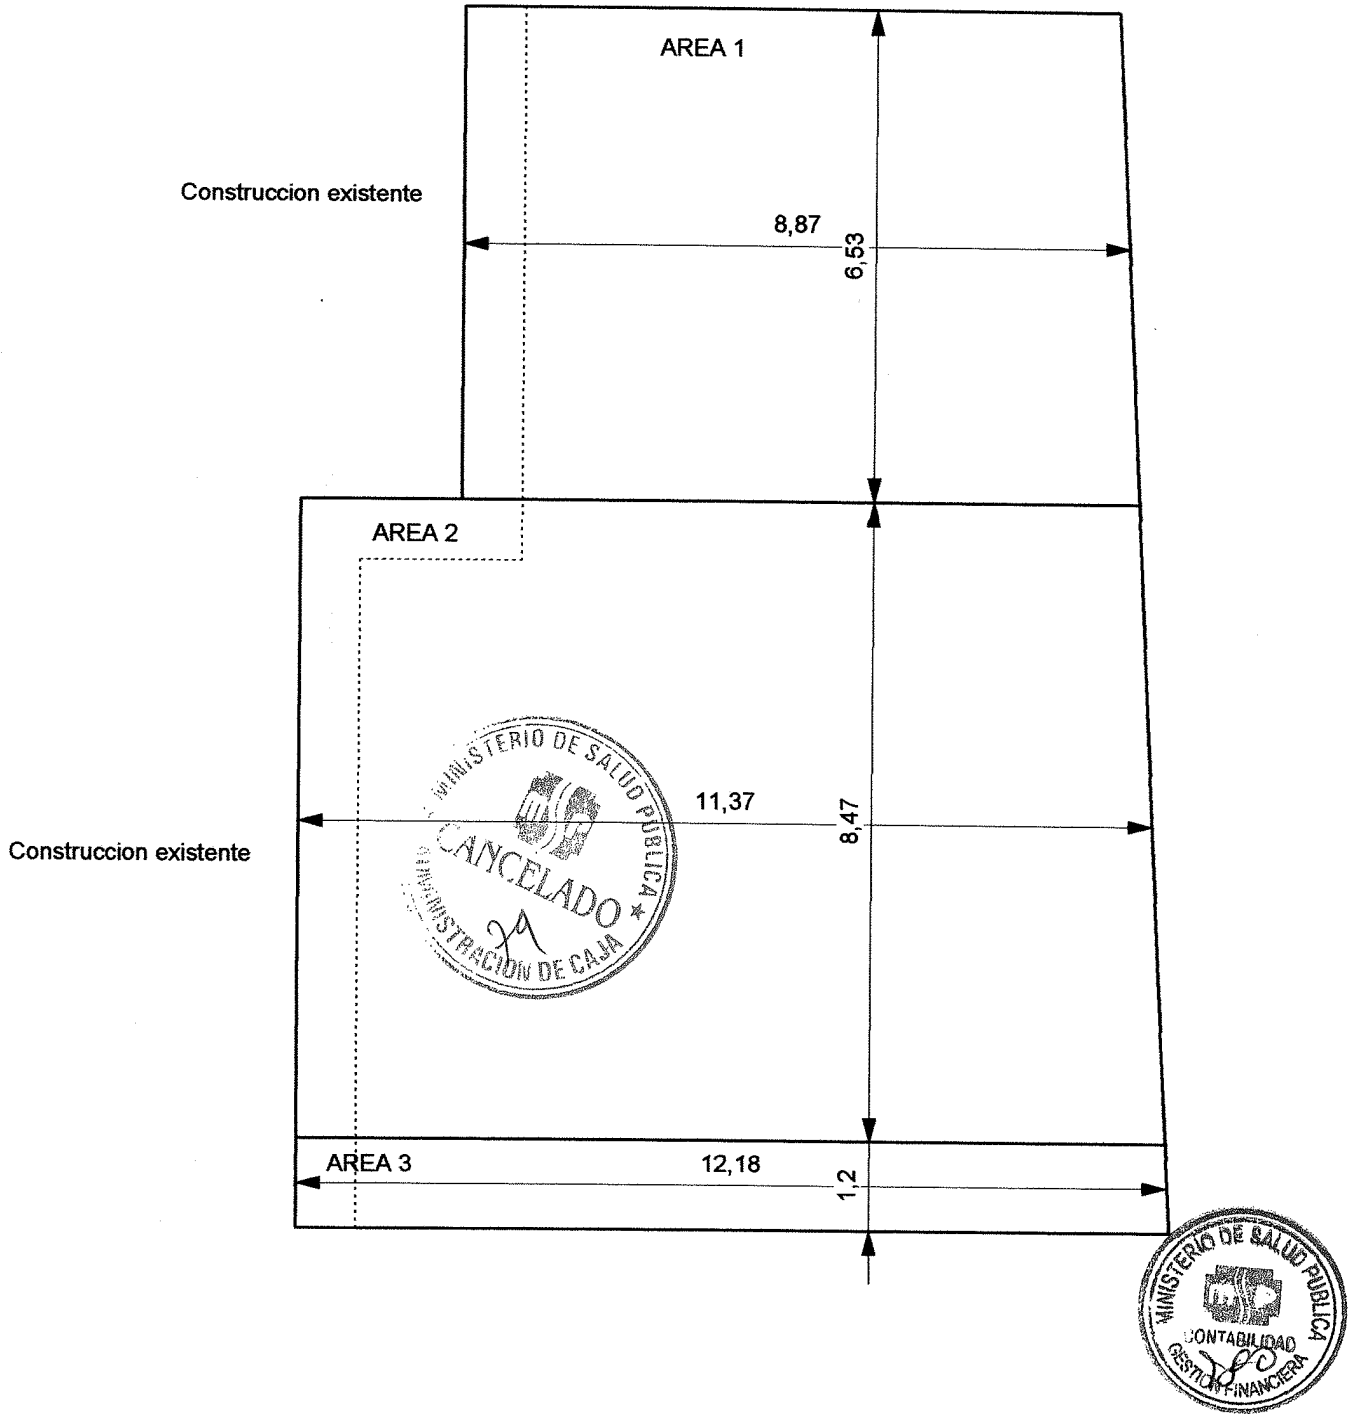

ANEXO

Obra: Construcción Centro de Salud de Ricaurte

Canton: Cuenca

PLANILLA DE OBRA No. UNICA

Rubro

1.003 Desmontaje de rejas y puertas de hierro forjado

1.003 Desmontaje de rejas y puertas de hierro forjado

Largo (m)	Ancho/Alto (m)	Numero (u)	Total (m2)	Observaciones
7.16	8.94	1.00	64.01	estructura existente
1.00	2.00	2.00	4.00	ventana y protección fachada const existente
2.00	1.00	1.00	2.00	ventana y protección fachada const existente
1.67	2.52	1.00	4.21	puerta proteccion existente
Total:			74.22	m2
			11.22	m2
			63.00	m2

PLANILLA ADICIONAL
PLANILLA CONTRACTUAL



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR


PROYECTO: Construcción Centro de Salud de Ricaurte, Provincia del Azuay
 RUBRO N° 1,003
 RUBRO: Desmonte de rejas y puertas de hierro forjado
 UNIDAD: m2
 PRECIO UNITARIO: 1.63

PLANILLA: UNICA
 PERIODO: 3 de Agosto al 31 de octubre 2008

ELEMENTO	DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
OBRAS PRELIMINARES	Desmonte de rejas y puertas de hierro forjado	74.22	
CANTIDAD CONTRACTUAL		63.00	
CANT. CONTRACTUALES EN PLANILAS ANTERIORES		0.00	
CANT. ADICIONALES EN PLANILAS ANTERIORES		0.00	
CANTIDAD EJECUTADA EN PRESENTE PERIODO		74.22	
CANTIDAD CONTRACTUAL EN PLANILLA ACTUAL		63.00	
CANTIDAD ADICIONAL EN PLANILLA ACTUAL		11.22	
CANTIDAD CONTRACTUAL ACUMULADA		63.00	
CANTIDAD ADICIONAL ACUMULADA		11.22	
VALOR DE RUBRO PLANILLA CONTRACTUAL ANTERIOR		0.00	
VALOR DE RUBRO PLANILLA ADICIONAL ANTERIOR		0.00	
VALOR DE RUBRO PLANILLA CONTRACTUAL		102.69	
VALOR DE RUBRO PLANILLA ADICIONAL		18.29	
VALOR DE RUBRO CONTRACTUAL ACUMULADO		102.69	
VALOR DE RUBRO ADICIONAL ACUMULADO		18.29	



RUBRO 1.003 DESMONTAJE DE REJA Y PUERTA DE HIERRO FORJADO

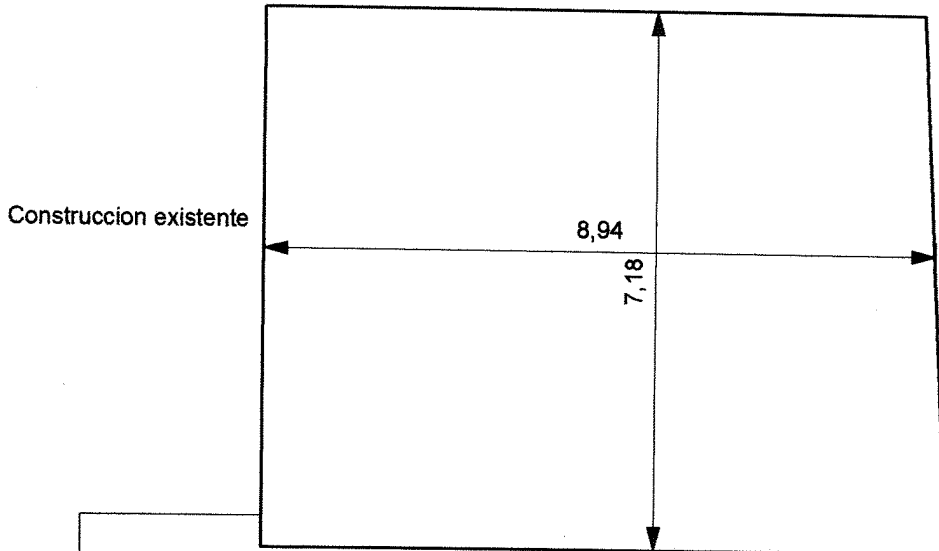

Construccion existente

