



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DOCUMENTO CONTABLE

Empresa: UNIDAD DE SALUD SUR

Nro: 2000000248

Beneficiario: VALLEJOS CUPUERAN JORGE ERNERSTO

Fecha: Quito, 22.07.2020

Concepto: 20200722-TRL10

QUITO TESORERÍA
SECRETARÍA DE SALUD CANCELADO
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR

Fecha: 22-07-2020

No. Julio 032

Firma: [Firma manuscrita]

Cuenta de Mayor	IO	Auxiliar	Descripción de la cuenta	Debe	Haber
2137301000			CXP BIENES Y SERV.PARA INVERSION	26.365,75	
1110399002			Cuentas tesorería única pagos multisociedad		26.365,75
Suma:				26.365,75	26.365,75

Valor a pagarse: 0,00	Son: Presupuesto: Año: Compromiso:
-------------------------------------	---

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	
CONTADOR	CONTADOR SUPERVISOR	CONTADOR GENERAL	

234



**GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**

RUC: 1760003410001
MATRIZ: VENEZUELA OE3-35 Y CHILE
SUCURSAL: VENEZUELA OE3-35 Y CHILE
Teléfono: 23120655 - Fax: 23120964 - QUITO - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución N°. 281
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 045-001-000002371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007202007176000341000120450010000023710000013018

Fecha Autorización: 20.07.2020 17:03:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007202007176000341000120450010000023710000013018

Retenido a: VALLEJOS CUPUERAN JORGE
ERNERSTO

Dirección: VICTOR HUGO E10-13 Y PARIS

Tipo de documento: Factura

No. de documento: 002-001-000000316

Fecha emisión documento: 14/07/2020

CC / RUC: 1001599800001

Fecha emisión comprobante retención: 20/07/2020

BASE IMPONIBLE	COD. IMPUESTO	IMPUESTO	% RETEN.	DESCRIPCIÓN	VALOR RETEN.
3.137,22	2	IVA	70,00	Servicios 70% 73	2.196,05
26.143,53	3440	RENTA	2,75	Servicios en General 2,75% 73	718,95
Total:					2.915,00

Cía: US33
Asiento Contable: 5100000130
Ejercicio Fiscal: 2020



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

DOCUMENTO CONTABLE

Empresa: UNIDAD DE SALUD SUR

Nro: 0600000046

Beneficiario:

Fecha: Quito, 29.07.2020

Concepto: IMPLEMENTACION MODULO DE

Cuenta de Mayor	IO	Auxiliar	Descripción de la cuenta	Debe	Haber
6315104000			SERVICIOS	29.280,75	
1529801000			APLICACION GASTOS DE GESTION		29.280,75
1529201000			ACUMULACION COSTOS INVERSION PROGRAMAS EN EJECUCIO	29.280,75	
1523402000			GTOS EN EDIFICIOS,LOCALES y RESIDENDENCIAS		29.280,75
1529801000			APLICACION GASTOS DE GESTION	29.280,75	
1529201000			ACUMULACION COSTOS INVERSION PROGRAMAS EN EJECUCIO		29.280,75
Suma:				87.842,25	87.842,25

Valor a pagarse: 0,00	Son:
	Presupuesto: Año: Compromiso:

IMPLEMENTACION DEL MODULO DE ASEO Y DESINFECCION DEL CAT.

ELABORADO POR  CONTADOR	REVISADO POR  CONTADOR SUPERVISOR	APROBADO POR CONTADOR GENERAL	
--	--	--	--

233

539747



MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ORDEN DE PAGO

Empresa: UNIDAD DE SALUD SUR

Nro.: 0600001640

Beneficiario: VALLEJOS CUPUERAN JORGE ERNERSTO

Asiento: 5100000130

Concepto: 002-001-000000316

Fecha: Quito, 20.07.2020 09:54:02

Fecha contabilización: 20.Julio.2020

Cuenta de Mayor	Auxiliar	Descripción de la cuenta	Debe	Haber
1523402000	GI00M10300006D	GTOS EN EDIFICIOS,LOCALES y RESIDENDENCIAS	29.280,75	
		ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD		
2137301000		CXP BIENES Y SERV.PARA INVERSION		26.365,75
2137303000		CXP Bienes y Serv. Par invers IVA 70% SER		2.196,05
2137325000		CXP ByS INVERS; Otras retenciones aplicables 2,75%		718,95

Suman:	29.280,75	29.280,75
--------	-----------	-----------

Valor a pagarse: 26.365,75	Son: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO USD
	Presupuesto
	Año: Compromiso:

60-46

IMPLEMENTACION DE MOD. DE ASEO Y DESINFECCION CAT. SEGUN MEMORANDONo. GADDMQ-UMSS-JM-2020-0088-M; ORDEN DE COMPRA No. EMER-MDMQ-SS-2020-29; CTTO No.2020-0019; CERTIFICACIONES			
ELABORADO POR 	REVISADO POR 	APROBADO POR	
CONTADOR	CONTADOR SUPERVISOR	CONTADOR GENERAL	

232

Hoja de entrada servicio 1000032349 añadir

Otro pedido

- Resumen
- ▶ RIASCOS & RIASCOS INGENIEROS CIA. L
 - ▶ TRANSPORTE ESCOLAR
 - ▶ INMOBILIARIA INTELCA CIA. LTDA.
 - ▶ SEGCOMPR CIA. LTDA.
 - ▶ COOP. DE TRANSPORTES 13 DE ABRIL
 - ▶ COMUNICAC. Y TELEF. MULTIPLES S.A
 - ▶ SERVICIO RADIOFRECUENCIA ARRASTRE 19:
 - SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA UMSS
 - PAGO MES DE MAYO RADIOFRECUENCIA
 - SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA
 - SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA
 - SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA
 - SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA
 - ▶ SERVICIO RADIOFRECUENCIA ARRASTRE 19:
 - SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA 2019
 - SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA 2020
 - SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA 2019 C# 00
 - SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA
 - SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA
 - SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA
 - ▶ ASOCIACION DE SERVIC. DE LIMPIEZA
 - GIRS-EP
 - NO ORTIZ
 - CORO MAILA
 - SANYCLEAN
 - LUCIO RON
 - RAMIREZ YUJATO
 - MORALES JURADO GALO RODRIGO
 - FASTTRACK S.A
 - ▶ VALLEJOS CUPUERAN
 - MODULOS DE ASEO
 - IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ASEC

Hoja de entrada 1000032349 Se acepta
 Para pedido 4400000095 10
 Texto breve IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ASEO

Ind. devoluciones

Dat. básic. Dat. acept. Val. TxtExpl Hist.

Creado LEARTEAGA
 Creado 15.07.2020
 Modif. LEARTEAGA
 Modif. 15.07.2020

Docs.modificación

Línea	L..	P	P..	N..	Nº servicio	Txt.br.	Cantidad	UM	Precio bruto	Mon.	Elemento PEP
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	60000467	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1	UN	26.143,53	USD	GI00M10300006D
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
120	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
130	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
140	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
170	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
190	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	
210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0,000		0,00	USD	

Línea 10

Memorando Nro. GADDMQ-UMSS-JM-2020-0088-M

Quito, D.M., 14 de julio de 2020

PARA: Sr. Mgs. Pedro Javier Salgado Alava
Subdirector Administrativo Financiero


ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS DE
ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN
TEMPORAL QUITO SOLIDARIO

De mi consideración:

Una vez que se a cumplido con el procedimiento de la IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO, solicito se prosiga con el trámite de pago correspondiente, conforme el peddido de pago No. gaddmq-lvbs-cat-2020, adjunto documentación en físico, ya que el tamaño excede el permitido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Orlando Israel Miranda Salinas
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

Autorizado
Por favor su gestión para
revisión y posterior pago



MEMORANDO N°. GADDMQ-LVBS- CAT-2020

DM Quito, 14 de julio del 2020

PARA: Msc. Javier Salgado
SUB DIRECTOR FINANCIERO

DE: Ing. Israel Miranda
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

ASUNTO: TRÁMITE DE PAGO

Una vez que se ha cumplido con el procedimiento para la contratación del "IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO " **por VEINTE Y NUEVE MIL DOS CIENTOS OCHENTA DÓLARES CON 75/100 (\$29.280,75) incluye IVA** adjunto el expediente respectivo, a fin de que se sirva autorizar y disponer a quien corresponda se trámite el pago correspondiente

CASA COMERCIAL	PRAXIS
FACTURA #	No. 002-001000000316 ORIGINAL Y COPIA VALIDEZ DE LA FACTURA SRI
ACTA ENTREGA RECEPCION	EMER-MDMQ-SS-2020-029
ADMINISTRADOR DE CONTRATO	Ing. ISRAEL MIRANDA
GARANTIA TECNICA	VIGENCIA PARA EL PROCESO
COMPROMISO DE GASTO	N°.4400000095
PEDIDO DE COMPRA	N°.4400000095
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	N°. 1000055367
CONTRATO	N°. 2020-0019

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Israel Miranda
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR

“SE CERTIFICA QUE EL TRÁMITE QUE SE PRESENTA PARA EL PAGO A LA DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA, HA CUMPLIDO CON TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE RIGOR EXIGIDOS POR NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y NORMATIVA INTERNA DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y DEMÁS ANEXOS REPOSAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA, PARA FUTURAS VERIFICACIONES O EXÁMENES DE ORGANISMOS DE CONTROL, SIENDO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE ESTA DEPENDENCIA CUALQUIER OMISIÓN O INOBSERVANCIA DE LA LEY.”

<p>CONTROL PREVIO:</p>  <p>Sr. Elier Padilla CONTABILIDAD</p>	<p>APROBADO POR:</p>  <p>Msc. Javier Salgado SUB DIRECTOR FINANCIERO</p>
--	---

228



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001599800001

Autorización
1126457239

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000316

Fecha emisión
14/07/2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social VALLEJOS CUPUERAN JORGE ERNESTO		Nombre comercial CENTRO DE CAPACITACIÓN CONTINUA "PRAXIS"	
Dirección matriz VICTOR HUGO E10-13 Y PARIS		Dirección establecimiento VICTOR HUGO E10-13 Y PARIS	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-04-21	Código imprenta 6707	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

226

	PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTA ENTREGA RECEPCIÓN		
	CODIGO AER-UMSS	VERSION 01	Pág. 1 de 9

PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ACTA:	DE ENTREGA
TIPO DE ACTA:	TOTAL
CÓDIGO:	EMER-MDMQ-SS-2020-029
PROCEDIMIENTO:	EMERGENCIA
OBJETO DE CONTRATACIÓN:	" IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO "

Comparecientes

En la ciudad de Quito, a los 23 días de junio del 2020, comparecen Ing. Israel Miranda, responsable de mantenimiento, funcionario del GAD MDMQ Unidad Metropolitana de Salud Sur, y por otra parte el Sr. Jorge Ernesto Vallejos Cupueran, representante de PRAXIS en su calidad de contratista, con el objeto de dejar constancia de la presente diligencia de la Entrega Recepción, del "IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO"

PRIMERA. - ANTECEDENTES

Dentro del proceso de Adquisición del " IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO"

Mediante Memorando No. GADDMQ-UMSS-JM-2020-0060-M, EL Ing. Israel Miranda responsable de mantenimiento solicita la " IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO"

Siguiendo los procedimientos con Memorando No GADDMQ-UMSS- 2020-0292-M, el Mgs. Javier Salgado como máxima autoridad de la UMSS autoriza la contratación de la " IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO"

Para este fin se adjunta:

- Términos de referencia
- Estudio económico
- Certificaciones CPC
- Certificaciones POA
- Certificaciones de catálogo electrónico

	PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTA ENTREGA RECEPCIÓN		
	CODIGO AER-UMSS	VERSION 01	Pág. 2 de 9

Siguiendo con los lineamientos correspondiente se emite la ORDEN DE COMPRA con código EMER-MDMQ-SS-2020-029, con fecha de 18 de junio del 2020.

EXPOSICIÓN DE LA NECESIDAD

El Dr. Jorge Yunda Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, mediante Resolución No. A 020 de 12 de marzo de 2020, declaró en estado de emergencia grave a todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, en razón de la declaratoria del COVID-19

- El Dr. Jorge Yunda Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, mediante resolución No. A 023 de 19 de marzo de 2020, delego a los servidores públicos enlistados en el artículo uno de la resolución de Alcaldía No. A019 de 17 de febrero de 2020.
- El Dr. Jorge Yunda Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, mediante resolución No. A 019 de 17 de febrero de 2020, resolvió delegar a los servidores públicos enlistados en esta resolución, entre otros a las máximas autoridades de las Unidades Desconcentradas de Salud, Educación y Administraciones Zonales para que, dentro sus competencias actúen como autorizadores de gasto en la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras, contratación de servicios incluidos los de consultoría, a excepción de la declaratoria de emergencia, determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, conforme los montos de contratación que resulten de multiplicar los coeficientes que se detallan en el siguiente cuadro, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado.
- Con Resolución No. UMSS –D-2020-001 el Director de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, Mgs. Javier Salgado Alava, declara con fecha 27 de marzo 2020, en estado de emergencia a la Unidad Metropolitana de Salud Sur.
- Con Oficio N° GADDMQ-SS-2020-0620-OF , Resolución No. 001-2020, el Dr. Lenin Mantilla Colamarco, Secretario de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, declara con fecha 29 de marzo 2020, en estado de emergencia a la Secretaria Metropolitana de Salud.
- Con Acta de Reunión realizada el 31 de marzo 2020 con el tema de Estrategias para enfrentar emergencia sanitaria frente a pandemia por COVID-19 en la que se detalla los EPP a ser considerados así: soluciones de base alcohol, bolsas para desechos hospitalarios, bolsa mortuoria, protector facial, toallas desechables, desinfectantes para superficies, guantes estériles y no estériles, gafas, batas, jabón líquido, mascarilla médica, respiradores N95, recipientes para corto punzantes.
- Con Oficio Nro. GADDMQ-SS-2020-0625-OF de la Secretaria Metropolitana de Salud con fecha 01 de abril de 2020, garantiza los recursos para el abastecimiento de prendas de protección de bioseguridad, insumos médicos, medicamentos, pruebas COVID-19, que deban ser adquiridos para afrontar la Emergencia Sanitaria COVID-19.
- El artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que: "Para atender las situaciones de emergencia definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, para justificar la contratación."
- Con Oficio Nro. GADDMQ-SS-2020-0696-OF, del 17 de abril de 2020, que dispone: "Con este antecedente, la Secretaría de Salud, elaboró el proyecto denominado CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL "QUITO SOLIDARIO", a fin de prestar atención de salud a pacientes con síntomas leves, moderados para COVID-19 y asintomáticos con prueba COVID-19 positiva.. instalaciones que dispondrán de 370 camas, distribuidas en los dos pisos, siendo la planta baja para ubicación de pacientes hombres y el segundo piso para pacientes mujeres, contará con 23 áreas médicas y se atenderán servicios asistenciales y de

224

	PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTA ENTREGA RECEPCIÓN		
	CODIGO AER-UMSS	VERSION 01	Pág. 3 de 9

apoyo diagnóstico terapéutico, las 24 horas del día, y siete días a la semana. El mencionado proyecto, fue incluido en el POA de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, como actividad de inversión, por esta razón, DISPONGO el inicio inmediato del proceso de inversión correspondiente”.

Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de elusión de los procedimientos.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Los términos de referencia para la contratación de la "IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO", de conformidad con la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016 y su codificación, SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN LOS TDR DEL EXPEDIENTE.

SEGUNDA.- BIENES RECIBIDOS

PROVEEDOR	PRAXIS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	JORGE VALLEJOS
FACTURA No.	316
PEDIDO DE COMPRA	440000095

TERCERA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS

- Objeto de contratación: "IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO"
- Fecha de emisión de la orden de compra: 18 de junio del 2020
- Fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación: 18 de junio del 2020
- Fecha de suscripción del contrato: 19 de junio del 2020
- Rango de Plazo de entrega: 5 días a partir de la notificación de adjudicación
- Fecha de entrega del bien: 23 de junio del 2020
- Lugar de entrega: Centro de Atención Temporal Quito Solidario
- Condiciones de los servicios requeridos :

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT. REQUERIDA	
1	Fabricación e instalación de Módulo de aseo y desinfección: Estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, instalado, resistente al agua material impermeable piso antideslizante de 1x1x2,05 m	UNIDAD	10
2	Fabricación e instalación de Vestidor: consta de una puerta corrediza para el ingreso, colgadores, Estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, instalado, resistente al agua material impermeable piso antideslizante de 1x1x2,05 m que incluya Silla para vestidor pequeña y tres Colgadores plásticos	UNIDAD	10
3	Instalación Rejilla de piso 50 MM	UNIDAD	10
4	Instalación de Gabinete metálico 40x30x20	UNIDAD	1
5	Instalación de braker 2p 32A	UNIDAD	10
6	Instalación de braker 1p 10A	UNIDAD	1
7	Punto de iluminación cable 1x12+1x12+ 1x14 TTH AWG	PUNTO	10
8	tubería Conduit AMT 3/4"	METRO	15,76
9	Luz led 18 W 110 V 250 LUM	UNIDAD	10
10	Punto de ducha con tubería Conduit AMT 3/4" cable 1x10+1x10+ 1x10 TTH AWG, 220v 5400W F-F-T	UNIDAD	10
11	Instalación Ducha eléctrica de 5400 W 220V de alto tráfico	UNIDAD	10
12	Braker caja moldeada 3P 100 A	UNIDAD	3
13	Alimentador 1x4+ 1x4+1x10 +1x10 TTH	METRO	79,2
14	Tubería Conduit 2" EMT	METRO	79,2
15	Centro de carga Bifásico 6 espacios	UNIDAD	2
16	Centro de carga Bifásico 8 espacios	UNIDAD	1
17	Instalación de punto de agua fría PVC INC accesorios 1/2 "	PUNTO	19
18	Perforaciones y resanado de losa con cemento de alto fraguado.	UNIDAD	15
19	Instalación de tubería PVC de 110mm, sujetado con cinta hilty	METRO	77,35
20	Instalación de tubería PVC de 50 mm, sujetado con cinta hilty	METRO	15,65
21	Puntos de desagüe de 50 mm INCL accesorios" para duchas y lavabos	PUNTO	19
22	Instalación de tubería de 1" para matriz de duchas y lavabos	METRO	78,89
23	Instalación de sistema de bombeo para lavabos y duchas, que incluye: bomba 1Hp 110V tanque de almacenamiento de 1000 lt mangueras, tubería de acople, controlador de presión, medidor de presión, actuador electromecánico, llave de paso, accesorios, instalación sujeción montaje puesta en marcha y pruebas de funcionamiento	UNIDAD	1

222

	PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTA ENTREGA RECEPCIÓN		
	CODIGO AER-UMSS	VERSION 01	Pág. 5 de 9

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT. REQUERIDA	
24	Instalación de tablero de control para bomba de presión.	UNIDAD	1
25	Fabricación e instalación de lavamanos en tubo de acero inoxidable, tol inoxidable, de ancho 58,5cm largo 2.00cm alto 0.90cm profundidad del pozo 0,35cm, incluye: 3 juegos de llaves con sensor para lavamanos, con división de acrílico, accesorios	UNIDAD	3
26	Instalación de Juegos de grifería para lavamanos con sensor de presencia y apagado automático	UNIDAD	9
27	Fabricación e instalación de Lavamanos portátil MDF con dos tanques para carga de agua y desagüe con bomba de succión y con tres dispensadores; papel jabón y gel 60x50x140 cm	UNIDAD	3
28	Limpieza y desalojo de escombros final	UNIDAD	1

- **Oferta ganadora**

JORGE VALLEJOS, POR EMERGENCIA

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE CONTRATO

Multas y sanciones:	Ninguna
Inconvenientes de orden operativo, técnico, entre otros	Ninguna
Retrasos e incumplimientos injustificados:	Ninguna
Contrato complementario	NO
Garantías presentadas	SI

CUARTA - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Plazo para la entrega:	5, DIAS
Fecha de cumplimiento efectivo:	23 de junio del 2020
Prórroga de plazo	Ninguna

221

	PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTA ENTREGA RECEPCIÓN		
	CODIGO AER-UMSS	VERSION 01	Pág. 6 de 9

El proveedor entregó los bienes el día 23 de junio del 2020, es decir dentro del plazo señalado, por lo tanto el proveedor cumplió con el plazo establecido.

La entrega se realizó de manera total, por tanto no existen rubros pendientes.

QUINTA - LIQUIDACION ECONÓMICA

DETALLE	CANTIDAD (VALOR)	OBSERVACIONES
Valor contrato	\$ 26.143,53	SIN IVA
Valor recibido	\$ 26.143,53	SIN IVA
Valores pendientes de pago	\$ 0,00	
Multa (en cantidad y porcentaje)		
Valores a devolver (si el caso amerita)		
Reajuste de precios		
SUBTOTAL	\$ 26.143,53	
IVA 12%	\$ 3.137,22	
TOTAL	\$ 29.280,75	

SÉXTA.- CONSTANCIA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN

El Administrador de Contrato, así como el Técnico no Interviniente dejan en constancia la recepción del servicio, sin ninguna novedad, y dentro de los plazos establecidos.

SEPTIMA.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Quienes suscriben la presente Acta Entrega Recepción dejan constancia de que el proveedor el señor Jorge Vallejos, ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el CONTRATO.

Las partes declaran que se ha dado cumplimiento a todas las condiciones y términos previstos, por lo que se deja en constancia además de que no existe incumplimiento alguno por parte del proveedor.

OCTAVA.- ACEPTACION

Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, firman los

220

Unidad Metropolitana de SALUD SUR <i>grande otra vez</i>	PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTA ENTREGA RECEPCIÓN		
	CODIGO AER-UMSS	VERSION 01	Pág. 7 de 9

intervinientes a la presente Acta de Entrega Recepción en 3 ejemplares de un Mismo tenor y efecto. En el Distrito Metropolitano de Quito, en la Ciudad de Quito el día 23 del mes de junio de 2020.



Ing. Israel Miranda
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Jorge Vallejos
CONTRATISTA



Sr. Paúl Acosta
TECNICO NO INTERVINIENTE

PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORME TÉCNICO NO INTERVINIENTE	
CODIGO: ITNI-SMS	VERSION 01

INFORME:	TECNICO NO INTERVINIENTE
CÓDIGO:	EMER-MDMQ-SS-2020-029
PROCEDIMIENTO:	EMERGENCIA
OBJETO DE CONTRATACIÓN:	" IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO "
ADMINISTRADOR:	Ing. ISRAEL MIRANDA
TÉCNICO NO INTERVINIENTE:	SR. PAÚL ACOSTA
PROVEEDOR ADJUDICADO:	PRAXIS
FECHA:	23 de JUNIO DEL 2020

ANTECEDENTES

Se realiza la revisión del expediente para la adquisición de " IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO " asignado con el Código EMER-MDMQ-SS-2020-029, mismo que consta de la documentación que se describe a continuación:

- Términos de referencia
- Estudio económico
- Certificaciones CPC
- Certificaciones POA
- Certificaciones de catálogo electrónico

DESARROLLO

- **Oferta ganadora**
Respecto de las especificaciones técnicas requeridas, se realiza el procedimiento de EMERGENCIA resultando adjudicado el proveedor Sr. JORGE VALLEJOS.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas y condiciones constantes en el contrato son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT. REQUERIDA		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	Fabricación e instalación de Módulo de aseo y desinfección: Estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, instalado, resistente al agua material impermeable piso antideslizante de 1x1x2,05 m	UNIDAD	10	Módulo de aseo y desinfección: Estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, instalado, resistente al agua material impermeable piso antideslizante de 1x1x2,05 m
2	Fabricación e instalación de Vestidor: consta de una puerta corrediza para el ingreso, colgadores, Estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, instalado, resistente al agua material impermeable piso antideslizante de 1x1x2,05 m que incluya Silla para vestidor pequeña y tres Colgadores plásticos	UNIDAD	10	Vestidor: consta de una puerta corrediza para el ingreso, colgadores, Estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, instalado, resistente al agua material impermeable piso antideslizante de 1x1x2,05 m
3	Instalación Rejilla de piso 50 MM	UNIDAD	10	Rejilla de piso 50 MM
4	Instalación de Gabinete metalico 40x30x20	UNIDAD	1	Gabinete metalico 40x30x20
5	Instalación de braker 2p 32A	UNIDAD	10	braker 2p 32A
6	Instalación de braker 1p 10A	UNIDAD	1	braker 1p 10A Punto de iluminación cable
7	Punto de iluminación cable 1x12+1x12+1x14 TTH AWG	PUNTO	10	1x12+1x12+ 1x14 TTH AWG
8	tubería Conduit AMT 3/4"	METRO	15,76	tubería Conduit AMT 3/4"
9	Luz led 18 W 110 V 250 LUM	UNIDAD	10	Luz led 18 W 110 V 250 LUM Punto de ducha con tubería Conduit AMT 3/4" cable 1x10+1x10+ 1x10 TTH
10	Punto de ducha con tubería Conduit AMT 3/4" cable 1x10+1x10+ 1x10 TTH AWG, 220v 5400W F-F-T	UNIDAD	10	AWG, 220v 5400W F-F-T Instalación Ducha eléctrica de 5400 W
11	Instalación Ducha eléctrica de 5400 W 220V de alto tráfico	UNIDAD	10	220V de alto tráfico
12	Braker caja moldeada 3P 100 A	UNIDAD	3	Braker caja moldeada 3P 100 A
13	Alimentador 1x4+ 1x4+1x10 +1x10 TTH	METRO	79,2	Alimentador 1x4+ 1x4+1x10 +1x10 TTH
14	Tubería Conduit 2" EMT	METRO	79,2	Tubería Conduit 2" EMT
15	Centro de carga Bifásico 6 espacios	UNIDAD	2	Centro de carga Bifásico 6 espacios
16	Centro de carga Bifásico 8 espacios	UNIDAD	1	Centro de carga Bifásico 8 espacios
17	Instalación de punto de agua fría PVC INC accesorios 1/2 "	PUNTO	19	Instalación de punto de agua fría PVC INC accesorios 1/2 "
18	Perforaciones y resanado de losa con cemento de alto fraguado.	UNIDAD	15	Perforaciones y resanado de losa con cemento de alto fraguado.
19	Instalación de tubería PVC de 110mm, sujetado con cinta hilty	METRO	77,35	instalación de tubería PVC de 110mm sujetado con cinta hilty
20	Instalación de tubería PVC de 50 mm, sujetado con cinta hilty	METRO	15,65	instalación de tubería PVC de 50 mm, sujetado con cinta hilty

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT. REQUERIDA		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
21	Puntos de desagüe de 50 mm INCL. accesorios" para duchas y lavabos	PUNTO	19	Punto totalmente hermético sellado y libre de filtraciones
22	Instalación de tubería de 1" para matriz de duchas y lavabos	METRO	78,89	Instalación de tubería PVC de 2"
23	Instalación de sistema de bombeo para lavabos y duchas, que incluye: bomba 1Hp 110V tanque de almacenamiento de 1000 lt mangueras, tubería de acople, controlador de presión, medidor de presión, actuador electromecánico, llave de paso, accesorios, instalación sujeción montaje puesta en marcha y pruebas de funcionamiento	UNIDAD	1	Instalación de sistema de bombeo para lavabos y duchas, que incluye: bomba 1Hp 110V tanque de almacenamiento de 1000 lt mangueras, tubería de acople, controlador de presión, medidor de presión, actuador electromecánico, llave de paso, accesorios, instalación sujeción montaje puesta en marcha y pruebas de funcionamiento
24	Instalación de tablero de control para bomba de presión.	UNIDAD	1	Instalación de tablero de control para bomba de presión.
25	Fabricación e instalación de lavamanos en tubo de acero inoxidable, tol inoxidable, de ancho 58,5cm largo 2.00cm alto 0.90cm profundidad del pozo 0,35cm, incluye: 3 juegos de llaves con sensor para lavamanos, con división de acrílico, accesorios	UNIDAD	3	Fabricación e instalación de lavamanos en tubo de acero inoxidable, tolinoxidable, de ancho 58,5cm largo 2.00cm alto 0.90cm profundidad del pozo 0,35cm, incluye: 3 juegos de llaves con sensor para lavamanos, con división de acrílico, , accesorios
26	Instalación de Juegos de grifería para lavamanos con sensor de presencia y apagado automático	UNIDAD	9	Juegos de grifería para lavamanos
27	Fabricación e instalación de Lavamanos portátil MDF con dos tanques para carga de agua y desagüe con bomba de succión y con tres dispensadores; papel jabon y gel 60x50x140 cm	UNIDAD	3	Lavamanos portátil MDF con dos tanques para carga de agua y desagüe con bomba de succión y con tres dispensadores; papel jabon y gel 60x50x140 cm
28	Limpieza y desalojo de escombros final	UNIDAD	1	limpieza y desalojo de escombros final

- **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 5 DIAS TERMINO
- **LUGAR DE ENTREGA:** CAT BICENTENARIO
- **ADMINISTRADOR DE CONTRATO:** Ing. ISRAEL MIRANDA

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Fecha de aceptación o suscripción de contrato:	19 de junio del 2020
Plazo para la entrega:	5 días término
Fecha de cumplimiento efectivo:	23 de junio del 2020
Prórroga de plazo	No existió, la entrega es total

	PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORME TÉCNICO NO INTERVINIENTE		
	CODIGO ITNI-UMSS	VERSION 01	Pág. 4 de 4

CUMPLIMIENTO DE VALORES ENTREGADOS

Valores	Cantidad USD	Observaciones
Valor adjudicado	\$26.143,53	SIN IVA
Valor recibido	\$26.143,53	SIN IVA
Valores pendientes de pago		La entrega fue total
Valores que deben deducirse X CONCEPTO DE MULTAS		NO se aplicaron multas
Valores que debe devolver por cualquier concepto		NO existen valores a devolver
Reajuste de precios		No aplica el reajuste de precios
VALOR TOTAL A PAGAR	\$29.280,75	con IVA

CONCLUSIÓN

El proveedor adjudicado ha cumplido con los aspectos establecidos en el CONTRATO y los bienes a entregar se encuentran dentro de los parámetros constantes en la orden de compra.

RECOMENDACIÓN

Sobre la base de lo expuesto se sugiere continuar con la recepción de los bienes y la suscripción de la respectiva acta.

Atentamente



Sr. Paúl Acosta

TÉCNICO NO INTERVINIENTE

215

PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORME ADMINISTRADOR	
CODIGO: EMER-MDMQ	VERSION 01

INFORME:	ADMINISTRADOR
CÓDIGO:	EMER-MDMQ-SS-2020-029
PROCEDIMIENTO:	EMERGENCIA SANITARIA
OBJETO DE CONTRATACIÓN:	" IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO "
ADMINISTRADOR:	Ing. Israel Miranda
TÉCNICO NO INTERVINIENTE:	Sr. Paúl Acosta
PROVEEDOR ADJUDICADO:	Jorge Vallejos
FECHA	23 DE JUNIO DEL 2020

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2020, el Msc. Pedro Javier Salgado en calidad de máxima autoridad de la Unidad Metropolitana de Salud Sur y él Sr. Jorge Vallejos, suscribieron el contrato N° 2020-0019, por concepto de la " IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO ", por un valor de USD \$29.280,75 VALOR QUE INCLUYE IVA. Para tal efecto se ha efectuado el procedimiento de contratación por EMERGENCIA, en cuyo expediente consta la siguiente documentación:

CITAR NUMERACIÓN Y TIPO DE DOCUMENTOS

- Informe de Necesidad
- Especificaciones técnicas o términos de referencia
- Estudio económico
- Certificación de stock
- Certificación POA
- Certificación PAC
- Certificación presupuestaria
- Otros documentos relevantes considerados y necesarios en los estudios

DESARROLLO

	PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORME ADMINISTRADOR		
	CODIGO IA-UMSS	VERSION 01	Pág. 2 de 3

Una vez revisada la documentación, cumpla con señalar las condiciones que rigen la presente adquisición:

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS

- Objeto de contratación: " IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO "
- Fecha de emisión de la orden de compra: 18 de junio del 2020
- Fecha de aceptación de la orden de compra: 18 de junio del 2020
- Fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación: 18 de junio del 2020
- Fecha de suscripción del contrato 19 de junio del 2020
- Rango de Plazo de entrega: 5 días término
- Fecha de entrega del bien: 23 de junio de 2020
- Lugar de entrega: CAT BICENTENARIO

- **Oferta ganadora**
JORGE VALLEJOS

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE CONTRATO

Multas y sanciones:	NO
Inconvenientes de orden operativo, técnico, operativos, entre otros	NO
Retrasos e incumplimientos injustificados:	NO
Contrato complementario (Servicios, consultoría, obras)	NO
Garantías presentadas	SI

3. LIQUIDACIÓN

La liquidación se realizará de conformidad con el siguiente detalle:

- **Liquidación de plazos:**

Plazo para la entrega:	5 días término
Fecha de cumplimiento efectivo:	23 de junio de 2020
Prórroga de plazo	No existió, la entrega es total

	PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES SUBPROCESO CERTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORME ADMINISTRADOR		
	CODIGO IA-UMSS	VERSION 01	Pág. 3 de 3

- **Liquidación económica:**

Valores	Cantidad USD	Observaciones
Valor adjudicado	\$ 26.143,53	SIN IVA
Valor recibido	\$ 26.143,53	SIN IVA
Valores pendientes de pago	\$ 0,00	
Valores que deben deducirse X CONCEPTO DE MULTAS		NO se aplicaron multas
Valores que debe devolver por cualquier concepto		NO existen valores a devolver
Reajuste de precios		No aplica el reajuste de precios
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 29.280,75	Con IVA

CONCLUSIÓN

El proveedor adjudicado ha cumplido con los aspectos establecidos en el Contrato y los bienes a entregar se encuentran dentro de los parámetros constantes en la orden de compra.

RECOMENDACIÓN

Sobre la base de lo expuesto se sugiere continuar con la recepción de los bienes y la suscripción de la respectiva acta entrega recepción.

Atentamente



Ing. Israel Miranda
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO DE "IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO".

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de mayo de 2020, comparecen de una parte, el señor Jorge Vallejos, a quien en adelante se denominará **CONTRATISTA**, por otra parte, **UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR**, representada legalmente por su **DIRECTOR GENERAL**, Señor **Mgs. JAVIER SALGADO ALABA**, quien actúa por sus propios y personales derechos con Registro Único de Contribuyentes N° **1760003410001**, que en adelante se denominará **CONTRATANTE**, y cuando el contexto se desprenda que se hace referencia a los dos contratantes denominados "Partes", y libre y voluntariamente, a través de sus representantes, acuerdan celebrar como en efecto, la siguiente acta de finiquito correspondiente a la "IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO"

Que otorga al tenor las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

El 19 de junio de 2020, el Msc. Pedro Javier Salgado en calidad de máxima autoridad de la Unidad Metropolitana de Salud Sur y el Sr. Jorge Vallejos, suscribieron el contrato N° 2020-0019, por concepto de "IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO". Por un valor de USD \$38.041,86 VALOR QUE INCLUYE IVA.

SEGUNDA: MARCO LEGAL

Clausula Undécima: Terminación del Contrato

- 1) Terminación del contrato: El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las condiciones particulares y generales del contrato.
- 2) Cláusulas de terminación Unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos Establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- 3) Procedimiento de terminación unilateral.- el procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

TERCERA: TERMINACIÓN

1. Con los antecedentes expuestos por las Partes, por este instrumento, libre y voluntariamente y por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales, dan por

terminado el Contrato de "IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO" individualizado en el literal 1 de la cláusula Marco Legal, inmediata anterior, terminación que se hace efectiva a los 24 días del mes de junio del 2020.

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Las partes libre y voluntariamente, declaran que a la fecha de terminación del Contrato de "IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO.", no tienen nada que reclamarse de presente o de futuro como consecuencia de la ejecución del Contrato y la consecuente terminación del mismo.


QUINTA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

Las partes se ratifican en el contenido de este acuerdo de terminación, en constancia de los cuales los suscriben por triplicado en la ciudad de Quito a los 24 días del mes de junio del 2020.

UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR



Ing. Israel Miranda
Administrador del Contrato



Jorge Vallejos
Contratista



Sr. Paúl Acosta
Técnico no Interviniente

210

**PRAXIS SERVICIOS DE DESINFECCIÓN**

RUC: 1001599800001

TELF. 095 861 2423

LISTADO DE PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO

N°	Nombres	Cédula	Cargo
1	VALENCIA LALANGUI LOUEDES GUADALUPE	1714132022	Ing. Jefe de obra
2	RECTO CANGO ANSELMO JUANITO	1710542992	Ing. Encargado de la parte eléctrica
3	FALCONES DELGADO MAURO GREGORIO	1310792500	Ing. Encagado de Plomería y supervisor de calidad
4	CANDO YAULI EDWIN VLADIMIRO	1713479580	Obrero
5	CHANCOSA PERUGACHI MARCO VINICIO	1002812491	Obrero
6	ESPINOZA TORRES LUIS ALFONSO	1001963428	Obrero
7	ROMERO CABRERA JULIO CESAR	1722710017	Obrero
8	ROSILLO ROSILLO ROBERT FABRICIO	2100196472	Obrero
9	VILLARREAL CASTELLANOS LUIS ALBERTO	1719274993	Obrero
10	VIZCAINO DIAS LUIS ENRIQUE	1709136244	Obrero
11	RENDON IBARRA JOSE EDUARDO	1311127961	Obrero
12	SIMBAÑA MUÑOZ OSCAR DANIEL	1721839130	Obrero
13	TAPIA VILLAREAL CARLOS ANDRES	1724754013	Obrero
14	VARGAS NEGRETE FREDDY ORLANDO	503330896	Obrero
15	MORALES GUAJAN JAIME GIOVANNY	1713590782	Obrero
16	PISUÑA GUALPA JORGE GIOVANI	1715457691	Obrero
17	GUAÑA FLORES WINTER ARMANDO	1725181356	Obrero

Att.

Psic. Jorge Vallejos C. Mag
DIRECTOR GENERAL PRAXIS.Víctor Hugo E10-13 y París,
entre Río Coca y Tomas de Berlanga
Telf. 2466975 / 095 861 2423

Persona que Recibe



PRAXIS SERVICIOS DE DESINFECCIÓN

RUC: 1001599800001

TELF. 095 861 2423

DIRECCIÓN: Víctor Hugo E10-13 y París

Certificado de materiales de no manufacturación

Yo Jorge Vallejos Cupuerán con ruc 1001599800001 certifico que el trabajo que se realizó al distrito metropolitano de Quito que consiste en la elaboración de 10 cabinas de aseo y 3 lavamanos, fueron realizados en su totalidad al ciento por ciento con material nuevo de primera calidad incluidos todos los accesorios primarios y secundarios que comprende tuberías y cableados y demás todo es nuevo y de almacén.

Atte.



Jorge Vallejos

Propietario del Centro de desinfección

Quito, Dm 21 de julio 2020

Certificado de Productos No Manufacturados

A quien le interese;

Batallas Financial Consulting CIA LTDA con Ruc 1791971825001 certifica que vendió a Jorge Ernesto Vallejos Cupuerán según factura 005-002-0000006403 con fecha 26-05-2020, representante de Servicios de Desinfección Praxis con RUC 1001599800001; 75 láminas de alucubond, garantizando la calidad del producto y que este es completamente nuevo.

El interesado puede hacer uso del presente en lo que mayormente le convenga.

Atentamente



**AUGUSTO BATALLAS
PRESIDENTE**

**Telf. 099 652 69 64
02 2496 500**

IMPORTADORA BATALLAS
Batallas Financial Co.
RUC: 1791971825001
FIRMA AUTORIZADA



RUC: 1791971825001
FACTURA No: 005-002-0000006403
NUMERO DE AUTORIZACION:
 2605202001179197182500120050020000064030004291816
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
 2020-05-26T12:39:39-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO
 2605202001179197182500120050020000064030004291816

BATALLAS FINANCIAL CONSULTING CIA LTDA
DIR MATRIZ:
 Calle B N31-38 y San Gabriel
DIR SUCURSAL:
 CALDERON
Contribuyente Especial:
Obligado a llevar Contabilidad: Si
Local Puenbo: 02 3895 732
Local Occidental: 02 2498 397 / 02 2496 500
Local Sur: 02 2679 201
Local Calderón: 02 2021 400

Correo Electrónico: contabilidad@batallas.com.ec

RAZON SOCIAL CLIENTE: JORGE VALLEJOS
EMISION: 26-mayo-2020 **RUC:** 1001599800001

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	UND	CANT	PRECIO	DSCTO	TOTAL
AC27001	ALUM. COMP VICO 3 mm BLANCO DOBLE CARA 2.44 x 1.22 m	SI	plancha	75.00	39.29	0.00	2,946.43

Forma de Pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor: 3,300.00 **Plazo:** 0 dias

Base 0 %:	0.00
Base 12 %:	2,946.43
Suma Bases \$:	2,946.43
Descuento \$:	0.00
Subtotal \$:	2,946.43
IVA 12 %:	353.57
Total \$:	3,300.00

Información Adicional

Teléfono: 2353973
Correo:
Dirección: JIPIJAPA
Crédito Hasta: 26/05/2020 0:00:00
Observación: TARJETA CREDITO

Facturado por: _____ **Despachado por:** _____

Yo, **JORGE VALLEJOS** declaro haber recibido, el material por mi adquirido a mi entera satisfacción en cantidad, calidad, colores y especificaciones técnicas por mi solicitados y declaro haberlos previamente verificado.
 Acepto todas y cada una de las cláusulas del contrato descrito al reverso de la presente factura.
Nombre: _____ **C.I. / RUC:** _____
Firma: _____

FAVOR EMITIR LAS RETENCIONES CUMPLIENDO EL ART. 95 RLRTI (...LA RETENCION DEBERÁ REALIZARSE AL MOMENTO DEL PAGO O CREDITO EN CUENTA...), CASO CONTRARIO DEBERÁ CANCELAR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

USO INTERNO:
 Y K GL Otro: _____



PRAXIS SERVICIOS DE DESINFECCIÓN

RUC: 1001599800001

TELF. 095 861 2423

DIRECCIÓN: Víctor Hugo E10-13 y París

ELABORACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y VESTIDORES

Fecha de inicio: 19 de Junio 2020

Fecha de culminación: 23 de junio 2020

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

RUC: 1760003410001


Dirección: Av. Adrián Navarro 1660 e Hinostraza

PLANILLA FINAL DE SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	PLANIFICACIÓN				CANTIDAD EJECUTADA				EJECUCIÓN
		Unidad	CAN.	V. UNT.	V. TOTAL	Unidad	CAN.	Valor total	V. TOTAL	
1	Fabricación e instalación de Módulo de aseo y desinfección: Estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, instalado, resistente al agua material impermeable piso antideslizante de 1x1x2,05 m	UNIDAD	10	\$550,00	\$5.500,00	UNIDAD	10	\$550,00	\$5.500,00	100%
2	Fabricación e instalación de Vestidor: consta de una puerta corrediza para el ingreso, colgadores, Estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, instalado, resistente al agua material impermeable piso antideslizante de 1x1x2,05 m que incluya Silla para vestidor pequeña y tres Colgadores plásticos	UNIDAD	10	\$520,00	\$5.200,00	UNIDAD	10	\$520,00	\$5.200,00	100%
3	Instalación Rejilla de piso 50 MM	UNIDAD	10	\$8,75	\$87,50	UNIDAD	10	\$8,75	\$87,50	100%
4	Instalación de Gabinete metalico 40x30x20	UNIDAD	1	\$225,77	\$225,77	UNIDAD	1	\$225,77	\$225,77	100%
5	Instalación de braker 2p 32A	UNIDAD	10	\$20,35	\$203,50	UNIDAD	10	\$20,35	\$203,50	100%
6	Instalación de braker 1p 10A	UNIDAD	1	\$15,25	\$15,25	UNIDAD	1	\$15,25	\$15,25	100%
7	Punto de iluminación cable 1x12+1x12+ 1x14 TTH AWG	PUNTO	10	\$26,30	\$263,00	PUNTO	10	\$26,30	\$263,00	100%
8	tubería Conduit AMT 3/4"	METRO	15,76	\$2,00	\$31,52	METRO	15,76	\$2,00	\$31,52	100%
9	Luz led 18 W 110 V 250 LUM	UNIDAD	10	\$15,45	\$154,50	UNIDAD	10	\$15,45	\$154,50	100%
10	Punto de ducha con tubería Conduit AMT 3/4" cable 1x10+1x10+ 1x10 TTH AWG, 220v 5400W F-F-T	UNIDAD	10	\$33,75	\$337,50	UNIDAD	10	\$33,75	\$337,50	100%
11	Instalación Ducha eléctrica de 5400 W 220V de alto tráfico	UNIDAD	10	\$36,00	\$360,00	UNIDAD	10	\$36,00	\$360,00	100%
12	Braker caja moldeada 3P 100 A	UNIDAD	3	\$108,00	\$324,00	UNIDAD	3	\$108,00	\$324,00	100%
13	Alimentador 1x4+ 1x4+1x10 +1x10	METRO	79,2	\$15,30	\$1.211,76	METRO	79,2	\$15,30	\$1.211,76	100%
14	Tubería Conduit 2" EMT	METRO	79,2	\$4,10	\$324,72	METRO	79,2	\$4,10	\$324,72	100%
15	Centro de carga Bifásico 6 espacios	UNIDAD	2	\$78,55	\$157,10	UNIDAD	2	\$78,55	\$157,10	100%
16	Centro de carga Bifásico 8 espacios	UNIDAD	1	\$85,25	\$85,25	UNIDAD	1	\$85,25	\$85,25	100%
17	Instalación de punto de agua fría PVC INC accesorios 1/2 "	PUNTO	19	\$28,40	\$539,60	PUNTO	19	\$28,40	\$539,60	100%
18	Perforaciones y resanado de losa con cemento de alto fraguado.	UNIDAD	15	\$8,50	\$127,50	UNIDAD	15	\$8,50	\$127,50	100%
19	Instalación de tubería PVC de 110mm,sujetado con cinta hilty	METRO	77,35	\$11,70	\$905,00	METRO	77,35	\$11,70	\$905,00	100%
20	Instalación de tubería PVC de 50 mm,sujetado con cinta hilty	METRO	15,65	\$5,97	\$93,43	METRO	15,65	\$5,97	\$93,43	100%

21	Puntos de desagüe de 50 mm INCL accesorios" para duchas y lavabos	PUNTO	19	\$42,50	\$807,50	PUNTO	19	\$42,50	\$807,50	100%	
22	Instalación de tubería de 1" para matriz de duchas y lavabos	METRO	78,89	\$5,24	\$413,38	METRO	78,89	\$5,24	\$413,38	100%	
23	Instalación de sistema de bombeo para lavabos y duchas, que incluye: bomba 1Hp 110V tanque de almacenamiento de 1000 lt mangueras, tubería de acople, controlador de presión, medidor de presión, actuador electromecánico, llave de paso, accesorios, instalación sujeción montaje puesta en marcha y	UNIDAD	1	\$875,00	\$875,00	UNIDAD	1	\$875,00	\$875,00	100%	
24	Instalación de tablero de control para bomba de presión.	UNIDAD	1	\$65,72	\$65,72	UNIDAD	1	\$65,72	\$65,72	100%	
25	Fabricación e instalación de lavamanos en tubo de acero inoxidable, tol inoxidable, de ancho 58,5cm largo 2.00cm alto 0.90cm profundidad del pozo 0,35cm, incluye: 3 juegos de llaves con sensor para lavamanos, con división de acrílico, accesorios	UNIDAD	3	\$1.850,00	\$5.550,00	UNIDAD	3	\$1.850,00	\$5.550,00	100%	
26	Instalación de Juegos de grifería para lavamanos con sensor de presencia y apagado automático	UNIDAD	9	\$183,67	\$1.653,03	UNIDAD	9	\$183,67	\$1.653,03	100%	
27	Fabricación e instalación de Lavamanos portatil MDF con dos tanques para carga de agua y desagüe con bomba de succión y con tres dispensadores; papel jabon y gel 60x50x140 cm	UNIDAD	3	\$170,00	\$510,00	UNIDAD	3	\$170,00	\$510,00	100%	
28	Limpieza y desalojo de escombros final	UNIDAD	1	\$122,00	\$122,00	UNIDAD	1	\$122,00	\$122,00	100%	
				Sub total	\$ 26.143,53					\$ 26.143,53	100%
				IVA	3137,22					3137,22	100%
				TOTAL	\$ 29.280,75					\$ 29.280,75	100%

Att.



Psic. Jorge Vallejos C. Mag
DIRECTOR GENERAL PRAXIS.

Víctor Hugo E10-13 y París, entre Río Coca y Tomas de Berlanga
Telf. 2466975 / 095 861 2423

Persona que Recibe

Firma

Nombre:


Ing. Israel Miranda



PRAXIS SERVICIOS DE DESINFECCIÓN

RUC: 1001599800001
 TELF. 095 861 2423
 DIRECCIÓN: Víctor Hugo E10-13 y París

ELABORACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y VESTIDORES

Fecha de inicio: 19 de Junio 2020

Fecha de culminación: 23 de junio 2020

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Día	Fecha	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALOR	EJECUCION
1	19/6/2020	Inspección, ingreso del personal, Ferroraciones y resanado de losa con cemento de alto fraguado; Instalación de tubería de 110mm, sujetado con cinta hilly, Puntos de desagüe de 2" para duchas y lavabos; Instalación de tubería de 1" para matriz de duchas y lavabos; Puntos instalación de agua potable para duchas; Puntos instalación de agua potable para lavamanos; Instalación de equipo de bombeo 1hp para lavabos y duchas; Instalación de tablero de control para bomba de presión	4869,36	100%
2	20/6/2020	Instalación de cableado desde el tablero principal hacia tres tableros de distribución, para duchas y luminaria de cabinas, cable 2/00, Breaker regulable amp 350 a 500 amp principal, breakers 2 dos polos 30/40, breakers de un polo de 20amp y escalerrillas	4021,77	100%
3	21/6/2020	Fabricación de lavamanos en tubo de acero inoxidable, tol inoxidable, llaves de sensor para lavamanos FV, instalado, con división de acrílico.	6072,00	100%
4	22/6/2020	Fabricación e instalación de cabinas para duchas y vestidores elaborado en estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, consta de una puerta corrediza para el ingreso, silla pequeña, colgadores, lampara para iluminación, interruptor. Ducha consta de cortina plástica para el ingreso, lampara para iluminación, ducha eléctrica Lorenzetti, llave, bandeja con tol galv. desagüe.	5500,00	100%
5	23/6/2020	Fabricación e instalación de Vestidor: consta de una puerta corrediza para el ingreso, colgadores, Estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, instalado, resistente al agua material, impermeable piso antideslizante de 1x1x2,05 m que incluya Silla para vestidor pequeña y tres Colgadores plásticos. Limpieza de escobros	5680,40	100%

SUBTOTAL	26143,53
IVA 12%	3137,22
TOTAL	29280,75

Att.

Jorge Vallejos C. Mag

Psic. Jorge Vallejos C. Mag
 DIRECTOR GENERAL PRAXIS.

Víctor Hugo E10-13 y París, entre Río Coca y Tomas de Berlanga
 Telf. 2466975 / 095 861 2423

Persona que Recibe

Firma

Nombre:

[Firma manuscrita]
 17 24381228

INFORME TÉCNICO MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN

Quito, 23 de junio 2020

Cliente: GAD del distrito Metropolitano de Quito

RUC: 1760003410001

Dirección: Av. Adrián Navarro 1660 e Hinostroza

CÓDIGO:	EMER-MDMQ-SS-2020-029
PROCEDIMIENTO:	EMERGENCIA
OBJETO DE CONTRATACIÓN:	" IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL QUITO SOLIDARIO "

Se describen a continuación los trabajos realizados:

Inspección, ingreso del personal; Perforaciones y resanado de losa con cemento de alto fraguado; Instalación de tubería de 110mm, sujetado con cinta hilty, Puntos de desagüe de 2" para duchas y lavabos; Instalación de tubería de 1" para matriz de duchas y lavabos; Puntos instalación de agua potable para duchas; Puntos instalación de agua potable para lavamanos; Instalación de equipo de bombeo 1hp para lavabos y duchas; Instalación de tablero de control para bomba de presión

Instalación de cableado desde el tablero principal hacia tres tableros de distribución, para duchas y luminaria de cabinas, cable 2/00, Breaker regulable amp 350 a 500 amp principal, breakers 2 dos polos 30/40, breakers de un polo de 20amp y escalerillas.

3 tableros con pulsador rojo (para fallo); azul (para marcha) e interruptor de ascendido, con 1 Hp de 110V y un breaker de 16 Ap, bipolar.

Caja de Distribución de 40X40 y 3 centros de carga de 6 puntos cada uno.

Tablero general trifásico con breaker principal de 300Ap, 10 contractores con 10 breakers trifásicos más 1 contractor de 6Ap para mando de control con barra para neutro y barra para tierra.

Fabricación de lavamanos en tubo de acero inoxidable, tol inoxidable, llaves de sensor para lavamanos FV, instalado, con división de acrílico.

Teléfonos: 099 364 3084

095 861 2423

099 902 5706

202

Fabricación e instalación de cabinas para duchas y vestidores elaborado en estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, consta de una puerta corrediza para el ingreso, silla pequeña, colgadores, lámpara para iluminación, interruptor. Ducha consta de cortina plástica para el ingreso, lámpara para iluminación, ducha eléctrica Lorenzetti, llave, bandeja con tol galv. desagüe.

Fabricación e instalación de Vestidor: consta de una puerta

corrediza para el ingreso, colgadores, Estructura tubo galvanizado, forrado, con alucubond color blanco, instalado, resistente al agua material, impermeable piso antideslizante de 1x1x2,05 m que incluya Silla para vestidor pequeña y tres Colgadores plásticos. Limpieza de escombros

Limpieza y desalojo de escombros final y cubrimiento de huecos para la construcción.

Rubros ejecutados:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT. REQUERIDA	
1	Fabricación e instalación de Módulo de aseo y desinfección: Estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, instalado, resistente al agua material impermeable piso antideslizante de 1x1x2,05 m	UNIDAD	10
2	Fabricación e instalación de Vestidor: consta de una puerta corrediza para el ingreso, colgadores, Estructura tubo galvanizado, forrado con alucubond color blanco, instalado, resistente al agua material impermeable piso antideslizante de 1x1x2,05 m que incluya Silla para vestidor pequeña y tres Colgadores plásticos	UNIDAD	10
3	Instalación Rejilla de piso 50 MM	UNIDAD	10
4	Instalación de Gabinete metálico 40x30x20	UNIDAD	1
5	Instalación de braker 2p 32A	UNIDAD	10
6	Instalación de braker 1p 10A	UNIDAD	1
7	Punto de iluminación cable 1x12+1x12+ 1x14 TTH AWG	PUNTO	10
8	tubería Conduit AMT 3/4"	METRO	15,76
9	Luz led 18 W 110 V 250 LUM	UNIDAD	10
10	Punto de ducha con tubería Conduit AMT 3/4" cable 1x10+1x10+ 1x10 TTH AWG, 220v 5400W F-F-T	UNIDAD	10

Teléfonos: 099 364 3084

095 861 2423

099 902 5706

201

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT. REQUERIDA	
11	Instalación Ducha eléctrica de 5400 W 220V de alto tráfico	UNIDAD	10
12	Braker caja moldeada 3P 100 A	UNIDAD	3
13	Alimentador 1x4+ 1x4+1x10 +1x10 TTH	METRO	79,2
14	Tubería Conduit 2" EMT	METRO	79,2
15	Centro de carga Bifásico 6 espacios	UNIDAD	2
16	Centro de carga Bifásico 8 espacios	UNIDAD	1
17	Instalación de punto de agua fría PVC INC accesorios 1/2 "	PUNTO	19
18	Perforaciones y resanado de losa con cemento de alto fraguado.	UNIDAD	15
19	Instalación de tubería PVC de 110mm, sujetado con cinta hilty	METRO	77,35
20	Instalación de tubería PVC de 50 mm, sujetado con cinta hilty	METRO	15,65
21	Puntos de desagüe de 50 mm INCL accesorios" para duchas y lavabos	PUNTO	19
22	Instalación de tubería de 1" para matriz de duchas y lavabos	METRO	78,89
23	Instalación de sistema de bombeo para lavabos y duchas, que incluye: bomba 1Hp 110V tanque de almacenamiento de 1000 lt mangueras, tubería de acople, controlador de presión, medidor de presión, actuador electromecánico, llave de paso, accesorios, instalación sujeción montaje puesta en marcha y pruebas de funcionamiento	UNIDAD	1
24	Instalación de tablero de control para bomba de presión.	UNIDAD	1
25	Fabricación e instalación de lavamanos en tubo de acero inoxidable, tol inoxidable, de ancho 58,5cm largo 2.00cm alto 0.90cm profundidad del pozo 0,35cm, incluye: 3 juegos de llaves con sensor para lavamanos, con división de acrílico, accesorios	UNIDAD	3
26	Instalación de Juegos de grifería para lavamanos con sensor de presencia y apagado automático	UNIDAD	9
27	Fabricación e instalación de Lavamanos portátil MDF con dos tanques para carga de agua y desagüe con bomba de succión y con tres dispensadores; papel jabón y gel 60x50x140 cm	UNIDAD	3


Teléfonos: 099 364 3084

095 861 2423

099 902 5706

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT. REQUERIDA	
		UNIDAD	
28	Limpieza y desalojo de escombros final		1

Imágenes

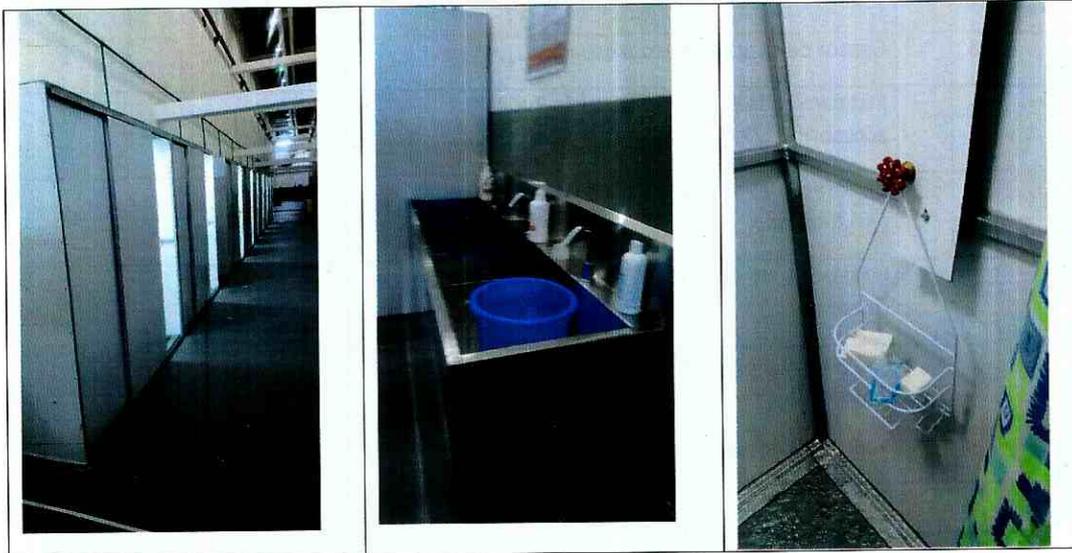


Teléfonos: 099 364 3084

095 861 2423

099 902 5706


199

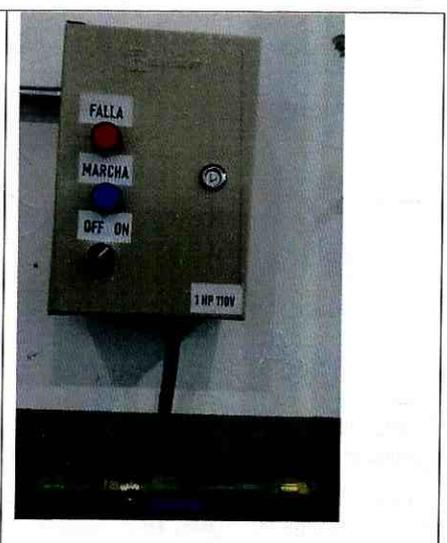

Teléfonos: 099 364 3084

095 861 2423

099 902 5706

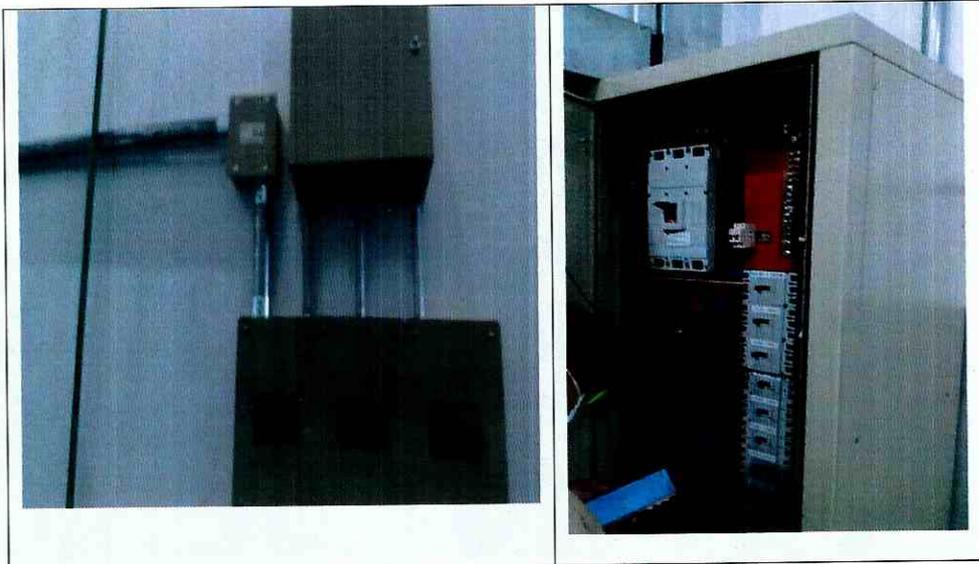

Atentamente;

Jorge Vallejos

Psic. Jorge Vallejos C. Mag
DIRECTOR GENERAL PRAXIS.

Víctor Hugo E10-13 y París, entre Río Coca y Tomas de Berlanga
Telf. 2466975 / 095 861 2423

Teléfonos: 099 364 3084

095 861 2423

099 902 5706

Quito, 23 de junio 2020

GARANTÍA MÓDULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN

Cliente: GAD del distrito Metropolitano de Quito

RUC: 1760003410001

Dirección: Av. Adrián Navarro 1660 e Hinostroza

Praxis, se compromete a otorgar la siguiente **GARANTÍA**

Garantía de 1 año previo análisis técnico, se cubre daños de fabricación, más no por mala manipulación, mal uso o daño doloso mal intencionado,

Nota: Fuera del mismo tendrá un costo extra, Praxis se hace cargo en el caso de que hay filtraciones.

Atentamente;



Psic. Jorge Vallejos C. Mag
DIRECTOR GENERAL PRAXIS.

Víctor Hugo E10-13 y París, entre Río Coca y Tomas de Berlanga
Telf. 2466975 / 095 861 2423
