


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 jun '20									
							X	J	V	S	D	L	M	X	J	
1	PROYECTO CCS	30 días	jue 28/05/20	dom 28/06/20												
2	✓ INICIO	0 días	jue 28/05/20	jue 28/05/20												
3	COMPRA DE MATERIALES	2 días	jue 28/05/20	vie 29/05/20												
4	✓ Compra Bloques y Postes de Hormigó	1 día	jue 28/05/20	jue 28/05/20	2											
5	✓ Compra Herrajes	1 día	jue 28/05/20	jue 28/05/20												
6	Compra Conductores desnudos y aislados	2 días	jue 28/05/20	vie 29/05/20												
7	✓ Compra Transformadores y Equipos de protección y seccionamiento	1 día	jue 28/05/20	jue 28/05/20												
8	✓ Compra de Aisladores y demás accesorios de redes	1 día	jue 28/05/20	jue 28/05/20												
9	TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES	3 días	vie 29/05/20	dom 31/05/20												
10	Transporte de Bloques y Postes de Hormigón y Fibra de Vidrio	2 días	vie 29/05/20	sáb 30/05/20	4											
11	Transporte de Herrajes	1 día	vie 29/05/20	vie 29/05/20	5											
12	Transporte de conductores desnudos y aislados	2 días	sáb 30/05/20	dom 31/05/20	6											
13	Transporte de Transformadores y Equipos de protección y	2 días	vie 29/05/20	sáb 30/05/20	7											
14	Transporte de Aisladores y demás accesorios de redes	1 día	vie 29/05/20	vie 29/05/20	8											
15	CONSTRUCCION	25 días	dom 31/05/20	vie 26/06/20												

Proyecto: PROGRAMA DE TRABAJO
Fecha: jue 28/05/20


Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
División		Hito inactivo		Sólo fin	
Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito externo		Resumen manual			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	01 jun '20											
							X	J	V	S	D	L	M	X	J			
16	Excavación de huecos, parada de postes y anclaje de tensores	4 días	dom 31/05/20	mié 03/06/20	10													
17	Vestido de postes	2 días	jue 04/06/20	vie 05/06/20	16;14													
18	Tendido y regulado de conductores aereos	5 días	sáb 06/06/20	mié 10/06/20	17													
19	Excavación de zanjas y pozos red subterránea	6 días	lun 01/06/20	sáb 06/06/20	12													
20	Tendido de conductores subterráneos	8 días	dom 07/06/20	mar 16/06/20	19													
21	Montaje de equipos: transformadores, pararrayos, seccionadores, etc.	6 días	mié 17/06/20	lun 22/06/20	18;20;:													
22	Energización y Pruebas	4 días	mar 23/06/20	vie 26/06/20	21													
23	FIN	0 días	vie 26/06/20	vie 26/06/20	22													

Proyecto: PROGRAMA DE TRABAJ Fecha: jue 28/05/20	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			

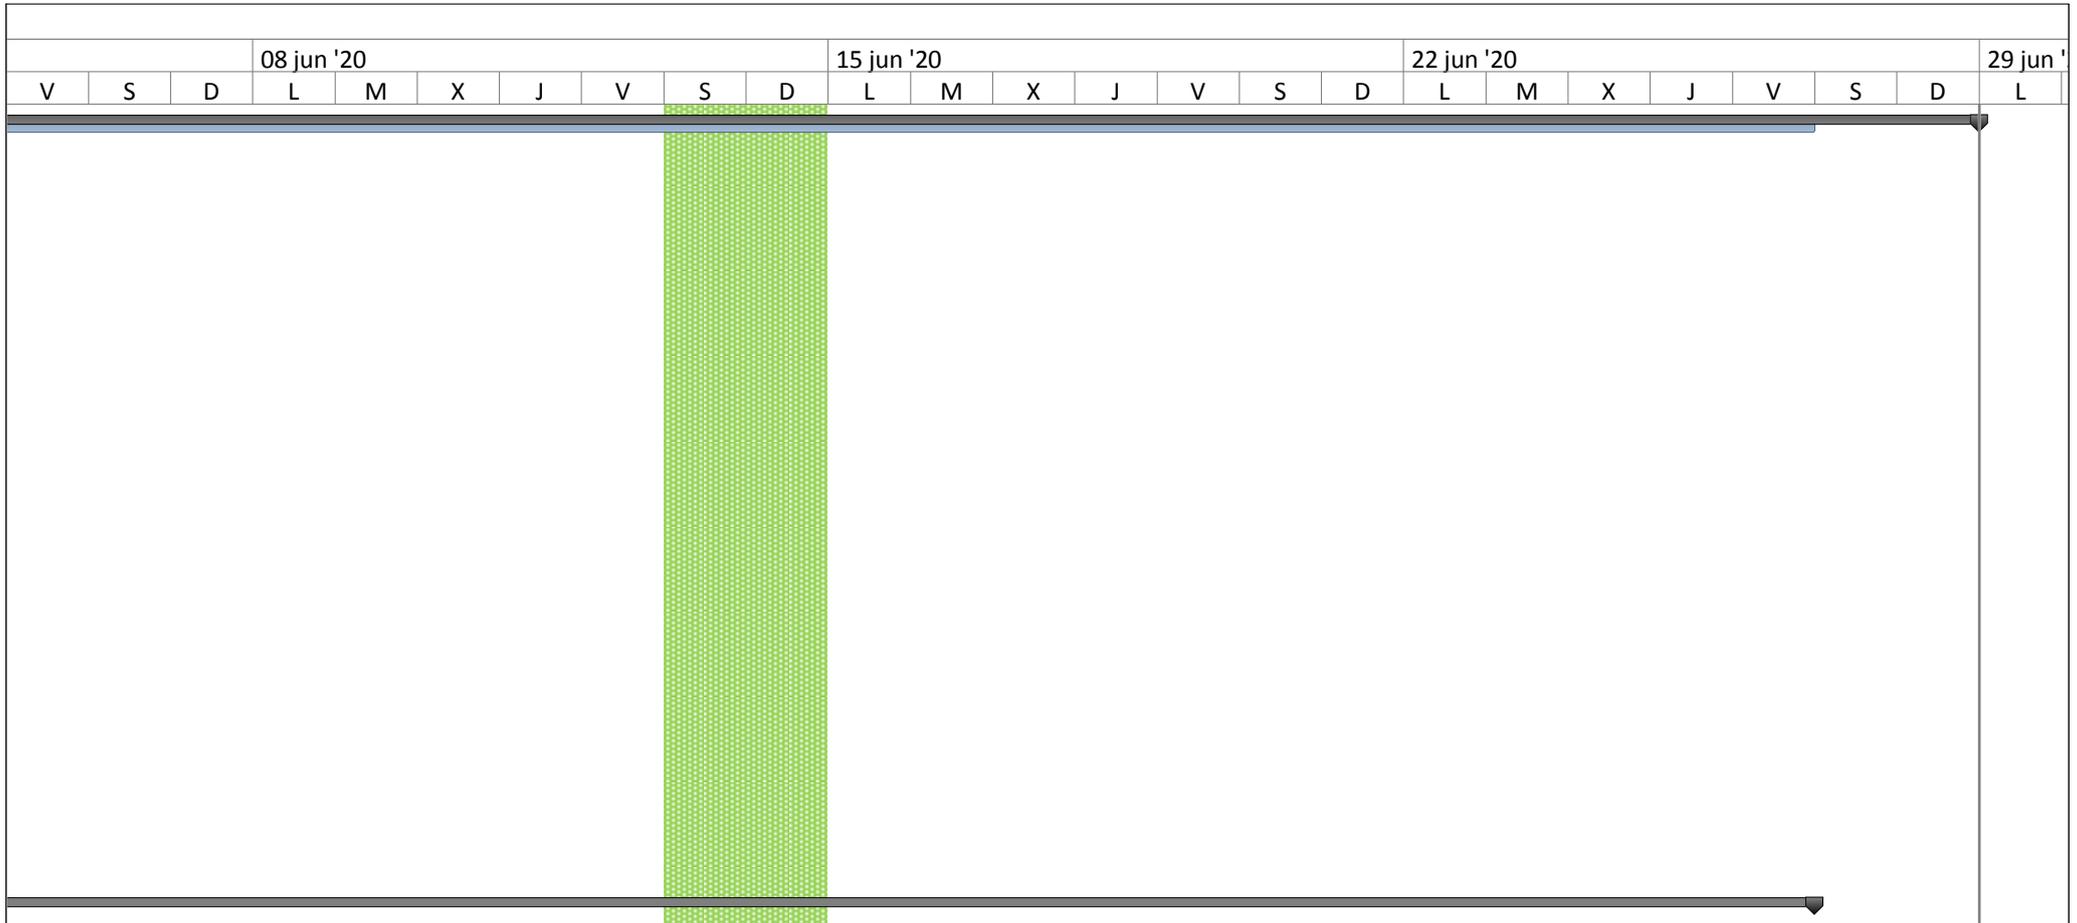

Proyecto: PROGRAMA DE TRABAJO Fecha: jue 28/05/20	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			

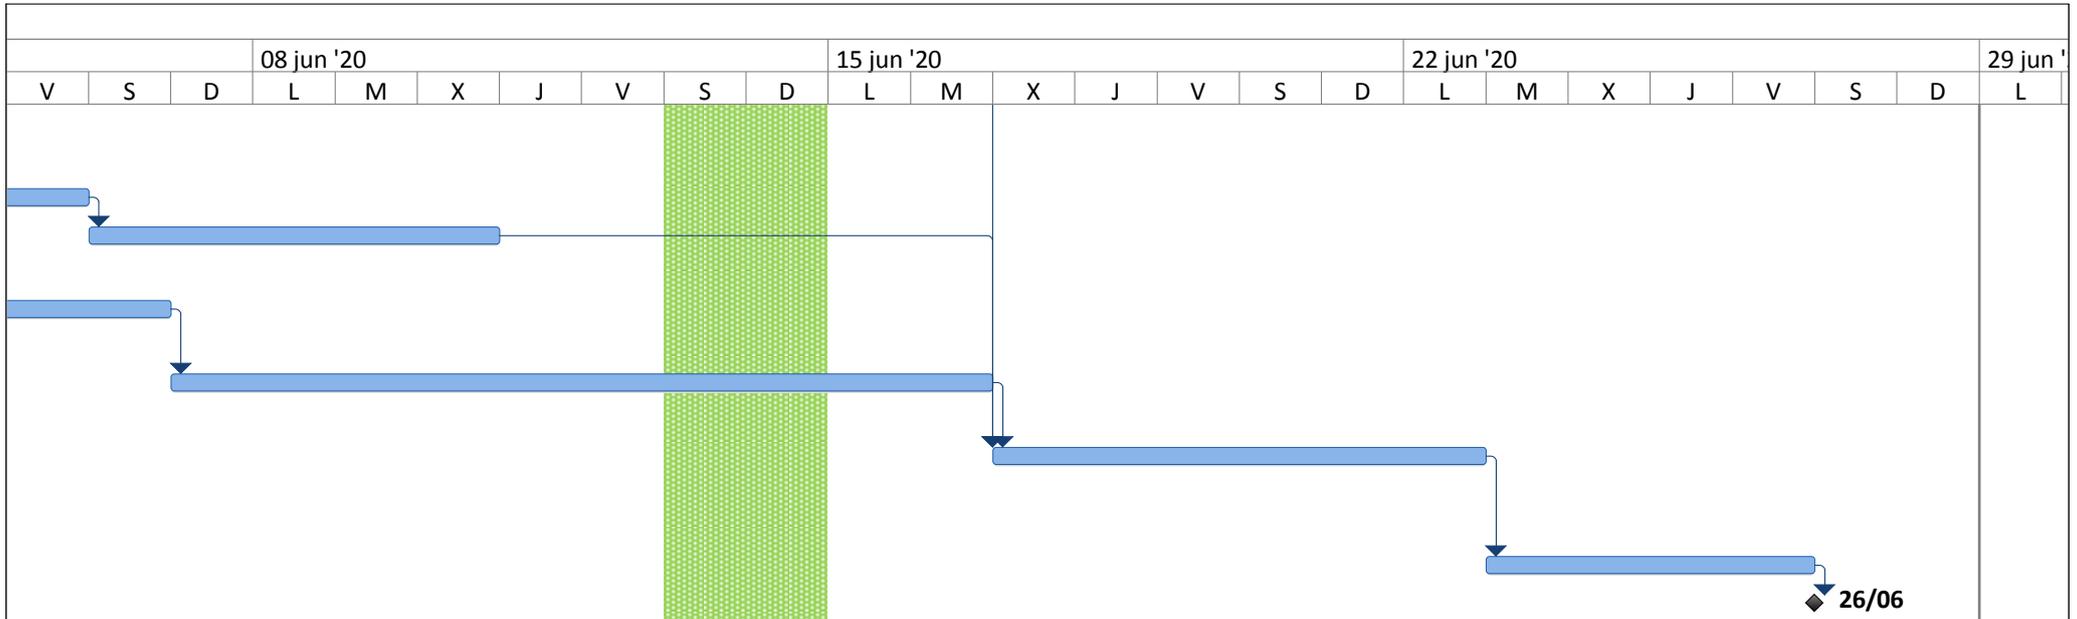

Proyecto: PROGRAMA DE TRABAJO Fecha: jue 28/05/20	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual			
